

Secretaria Municipal de Educação – SME

SME – Escolas – Construção – 2023 a 2025

Escolas	Região	Quantidade	Valor (R\$)			Origem do recurso	Data de início	Data de conclusão ou previsão de	Status em 31/12/2025
			Vinculado	Próprio	Total				
EM ROBERTO ALVES LIMA JÚNIOR (do Res. ACQUAVILLE)	LESTE	1	R\$ 8.108.266,32	R\$-	R\$ 8.108.266,32	Contrapartida de caucionamento	06/03/2020	04/10/2021	CONCLUÍDA
EM MACHADO DE ASSIS	SUL	1	R\$ 2.430.000,00	R\$-	R\$ 2.430.000,00	Contrapartida de caucionamento	12/05/2020	04/02/2022	CONCLUÍDA
EM FRANCISCO AQUINO	ZONA RURAL	1	R\$ 1.625.118,85	R\$-	R\$ 1.625.118,85	Contrapartida de caucionamento	25/08/2020	23/08/2022	CONCLUÍDA
EM AMERICA SABINO	NORTE	1	R\$ 4.897.757,40	R\$-	R\$ 4.897.757,40	Contrapartida de caucionamento	05/07/2021	07/02/2023	CONCLUÍDA
EM DO JARDIM SANTO ANDRÉ	NORTE	1	R\$ 9.920.000,00	R\$-	R\$ 9.920.000,00	Contrapartida de caucionamento	25/06/2025	01/08/2026	FASE DE EXECUÇÃO
TOTAL	-	7	R\$ 32.004.871,31	R\$-	R\$ 32.004.871,31	-	-	-	-

CADERNO DE AÇÕES E OBRAS 2026 – 2023-2025

SME – Escolas – Ampliação – 2023 a 2025

Escolas	Região	Quantidade	Valor (R\$)			Origem do recurso	Data de início	Data de conclusão ou previsão de	Status em 31/12/2025
			Vinculado	Próprio	Total				
EM MOACYR TEIXEIRA	NORTE	1	R\$ 1.235.805,00	R\$-	R\$ 1.235.805,00	Contrapartida de caucionamento	24/01/2020	26/11/2025	CONCLUÍDA
EM MOACYR TEIXEIRA	NORTE	1	R\$ 529.631,31	R\$-	R\$ 529.631,31	Contrapartida de caucionamento	24/01/2020	26/11/2025	CONCLUÍDA
EM NORMAN PROCHET	SUL	1	R\$ 1.609.892,12	R\$-	R\$ 1.609.892,12	Contrapartida de caucionamento	30/09/2020	???????	CONCLUÍDA
EM TEREZA CANHADAS	SUL	1	R\$ 500.485,64	R\$-	R\$ 500.485,64	Contrapartida de caucionamento	06/05/2021	02/08/2022	CONCLUÍDA
EM ROBERTO ALVES LIMA JUNIOR	LESTE	1	R\$ 250.242,82	R\$-	R\$ 250.242,82	Contrapartida de caucionamento	01/10/2022	10/11/2023	CONCLUÍDA
EM AMÉRICA SABINO	NORTE	1	R\$ 1.650.000,00	R\$-	R\$ 1.650.000,00	Contrapartida de caucionamento	25/04/2023	28/05/2024	CONCLUÍDA
EM PEDRO VERGARA	LESTE	1	R\$ 327.173,00	R\$-	R\$ 327.173,00	Contrapartida de caucionamento	26/06/2023	05/09/2024	CONCLUÍDA
EM SUELY IDERIHA	LESTE	1	R\$ 530.137,60	R\$-	R\$ 530.137,60	Contrapartida de caucionamento	15/08/2023	30/12/2024	CONCLUÍDA
EM SUELY IDERIHA	LESTE	1	R\$ 1.079.754,52	R\$-	R\$ 1.079.754,52	Contrapartida de caucionamento	15/08/2023	30/12/2024	CONCLUÍDA
EM AMÉRICA SABINO	NORTE	1	R\$ 2.904.922,56	R\$-	R\$ 2.904.922,56	Contrapartida de caucionamento	08/11/2023	28/10/2024	CONCLUÍDA
EM IGNEZ CORSO ANDREAZZA	NORTE	1	R\$ 713.573,91	R\$-	R\$ 713.573,91	Contrapartida de caucionamento	10/11/2023	28/10/2024	CONCLUÍDA
EM MARIA TEREZA MELEIRO	OESTE	1	R\$ 471.959,98	R\$-	R\$ 471.959,98	Contrapartida de caucionamento	10/11/2023	28/10/2024	CONCLUÍDA
EM ARISTEU DOS SANTOS RIBAS	NORTE	1	R\$ 330.000,00	R\$-	R\$ 330.000,00	Contrapartida de caucionamento	16/05/2025	06/10/2025	CONCLUÍDA
EM MACHADO DE ASSIS	SUL	1	R\$ 1.939.156,07	R\$-	R\$ 1.939.156,07	Contrapartida de caucionamento	2021	30/10/2024	CONCLUÍDA
EM MACHADO DE ASSIS	SUL	1	R\$ 501.914,34	R\$-	R\$ 501.914,34	Contrapartida de caucionamento	2021	30/10/2024	CONCLUÍDA
EM IRENE APARECIDA	SUL	1	R\$ 577.470,06	R\$-	R\$ 577.470,06	Contrapartida de caucionamento	30/01/2024	09/09/2024	CONCLUÍDA
EM JOÃO XXIII	OESTE	1	R\$ 4.365.061,22	R\$-	R\$ 4.365.061,22	Contrapartida de caucionamento	04/04/2025	01/08/2026	FASE DE EXECUÇÃO
EM RUTH FERREIRA	OESTE	1	R\$ 1.236.636,19	R\$-	R\$ 1.236.636,19	Contrapartida de caucionamento	01/10/2025	01/04/2026	FASE DE EXECUÇÃO

continua

CADERNO DE AÇÕES E OBRAS 2026 – 2023-2025

SME – Escolas – Ampliação – 2023 a 2025

conclusão

Escolas	Região	Quantidade	Valor (R\$)			Origem do recurso	Data de início	Data de conclusão ou previsão de	Status em 31/12/2025
			Vinculado	Próprio	Total				
EM MARIA IRENE VICENTINI	LESTE	1	R\$ 658.667,52	R\$-	R\$ 658.667,52	Contrapartida de caucionamento	01/11/2025	01/04/2026	FASE DE EXECUÇÃO
EM NINA GARDEMANN-LOTE 1	OESTE	1	R\$-	R\$ 10.004.695,91	R\$ 10.004.695,91	Recurso próprio	05/03/2024	02/09/2025	FASE DE FINALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ENTREGA DE OBRAS
EM NINA GARDEMANN-LOTE 2	OESTE	1	R\$-	R\$ 339.284,28	R\$ 339.284,28	Recurso próprio	05/03/2024	02/09/2025	FASE DE FINALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ENTREGA DE OBRAS
E.M. MABIO GONÇALVES PALHANO- LOTE 1	SUL	1	R\$-	R\$ 12.364.917,17	R\$ 12.364.917,17	Recurso próprio	21/03/2024	10/11/2025	FASE DE FINALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ENTREGA DE OBRAS
E.M. MABIO GONÇALVES PALHANO- LOTE 2	SUL	1	R\$-	R\$ 379.071,36	R\$ 379.071,36	Recurso próprio	21/03/2024	10/11/2025	FASE DE FINALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ENTREGA DE OBRAS
E.M. CARLOS ZEWE COIMBRA	LESTE	1	R\$-	R\$ 9.285.044,99	R\$ 9.285.044,99	Recurso próprio	06/03/2024	20/07/2025	FASE DE FINALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ENTREGA DE OBRAS
EM FRANCISCO PEREIRA DE ALMEIDA JUNIOR	LESTE	1	R\$-	R\$ 5.443.208,31	R\$ 5.443.208,31	Recurso próprio	01/02/2024	20/01/2025	CONCLUÍDA
E.M. HIKOMA UDIHARA	LESTE	1	R\$-	R\$ 8.627.807,35	R\$ 8.627.807,35	Recurso próprio	25/07/2024	29/04/2026	FASE DE EXECUÇÃO
EM Trabalho Campo e Saber	RURAL	1	R\$-	R\$ 8.240.250,33	R\$ 8.240.250,33	Recurso próprio	16/08/2023	30/10/2024	CONCLUÍDA
TOTAL	-	18	R\$ 21.412.483,86	R\$-	R\$ 21.412.483,86	-	-	-	-

SME – Escolas – Reforma – 2023 a 2025

Escolas	Região	Quantidade	Valor (R\$)			Origem do recurso	Data de início	Data de conclusão ou previsão de	Status em 31/12/2025
			Vinculado	Próprio	Total				
EM BENTO MUNHOZ R. NETTO	ZONA RURAL	1	R\$ 608.074,28	R\$-	R\$ 608.074,28	FUNDEB			
TOTAL	-	1	R\$ 608.074,28	R\$-	R\$ 608.074,28	-	-	-	-

CADERNO DE AÇÕES E OBRAS 2026 – 2023-2025

SME – Centros Municipais de Educação Infantil – Construção – 2023 a 2025

CMEIs	Região	Quantidade	Valor (R\$)			Origem do recurso	Data de início	Data de conclusão ou previsão de	Status em 31/12/2022
			Vinculado	Próprio	Total				
CMEI do Jd. NOVA ESPERANÇA	SUL	1	R\$-	R\$ 1.712.850,81	R\$ 1.712.850,81	Recurso próprio	jun/20	set/21	CONCLUÍDA
CMEI PASTORA SAMIRA JANENE	NORTE	1	R\$ 1.344.060,93	R\$ 666.489,99	R\$ 2.010.550,92	FNDE + Recurso próprio	set/18	10/03/2020	CONCLUÍDA
CMEI SIMEIRE ROZIMAR C. BARBOSA	LESTE	1	R\$ 1.336.649,75	R\$ 787.247,63	R\$ 2.123.897,38	FNDE + Recurso próprio	set/18	09/06/2020	CONCLUÍDA
CMEI do Res. ACQUAVILLE	OESTE	1	R\$ 3.157.840,49	R\$-	R\$ 3.157.840,49	Contrapartida de caucionamento	06/03/2020	28/09/2021	CONCLUÍDA
CEI ADRIANA VIEIRA MARAGNO GUAZZI	SUL	1	R\$ 4.451.593,72	R\$-	R\$ 4.451.593,72	Contrapartida de caucionamento	03/01/2024	26/11/2024	CONCLUÍDA
TOTAL	-	5	R\$ 10.290.144,89	R\$ 3.166.588,43	R\$ 13.456.733,32	-	-	-	-

SME – Centros Municipais de Educação Infantil – Ampliação – 2023 a 2025

CMEIs	Região	Quantidade	Valor (R\$)			Origem do recurso	Data de início	Data de conclusão ou previsão de	Status em 31/12/2025
			Vinculado	Próprio	Total				
CMEI IRMÃ MARIA NÍVEA	NORTE	1	R\$ 353.086,00	R\$ -	R\$ 353.086,00	Contrapartida de caucionamento	06/08/2020	20/05/2022	CONCLUÍDA
CMEI MARISA ARRUDA	NORTE	1	R\$ 250.242,82	R\$ -	R\$ 250.242,82	Contrapartida de caucionamento	29/11/2021	27/10/2023	CONCLUÍDA
CMEI YOLANDA SALGADO	NORTE	1	R\$ 283.657,13	R\$ -	R\$ 283.657,13	Contrapartida de caucionamento	19/12/2022	11/09/2023	CONCLUÍDA
CMEI TELMA CAVALHEIRI	OESTE	1	R\$ 500.000,00	R\$ -	R\$ 500.000,00	Contrapartida de caucionamento	20/06/2023	16/08/2024	CONCLUÍDA
CMEI HELENA OMETTO	SUL	1	R\$ 614.761,35	R\$ -	R\$ 614.761,35	Contrapartida de caucionamento	???????	09/09/2024	CONCLUÍDA
CMEI FRANCISCO QUESADA	LESTE	1	R\$ 1.000.971,28	R\$ -	R\$ 1.000.971,28	Contrapartida de caucionamento	14/10/2024	01/03/2026	FASE DE EXECUÇÃO
CMEI DIRCE DE ALMEIDA	SUL	1	R\$ 1.325.168,43	R\$ -	R\$ 1.325.168,43	Contrapartida de caucionamento	15/09/2025	01/03/2026	FASE DE EXECUÇÃO
CMEI TIÃO BALALÃO	SUL	1	R\$ 500.000,00	R\$ -	R\$ 500.000,00	Contrapartida de caucionamento	13/10/2025	01/04/2026	FASE DE EXECUÇÃO
TOTAL	-	5	R\$ 4.827.887,01	R\$ -	R\$ 4.827.887,01	-	-	-	-

CADERNO DE AÇÕES E OBRAS 2026 – 2023-2025


SME – Outras obras – 2023 a 2025

CMEIs	Região	Quantidade	Valor (R\$)			Origem do recurso	Data de início	Data de conclusão ou previsão de	Status em 31/12/2025
			Vinculado	Próprio	Total				
Construção Sede SME 1° Fase		1	-	R\$ 2.227.162,13	R\$ 2.227.162,13	Recurso próprio			CONCLUÍDA
CEI OSMAR ZANLUCHI	NORTE	1	R\$-	R\$ 4.263.631,55	R\$ 4.263.631,55	Recurso próprio	04/01/2024	16/09/2025	FASE DE FINALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ENTREGA DE OBRAS
CEI MADRE CATHERINE	OESTE	1	R\$-	R\$ 6.803.033,70	R\$ 6.803.033,70	Recurso próprio	04/01/2024	06/12/2024	CONCLUÍDA
TOTAL	-	3	R\$-	R\$ 13.293.827,38	R\$ 13.293.827,38	-	-	-	-

SME – Serviços de manutenção – Escolas e Centros Municipais de Educação Infantil – 2017 a 2022


Empresa	Contrato – Pregão	Valor (R\$)	Origem do recurso
2025			
-	-	-	-
2024			
-	-	-	-
2023			
-	-	-	-
2022			
Tekenge Eng. e Construções LTDA	Contrato 27/2022 – Pregão 13/2022	R\$ 6.010.983,17	FUNDEB + próprio
Operattus Construções Cíveis	Contrato 26/2022 – Pregão 13/2022	R\$ 1.937.585,12	FUNDEB + próprio
Operattus Construções Cíveis (pisos)	Contrato 194/2021 – Pregão 308/2021	R\$ 2.674.167,14	Próprio
Eduardo Vinícius Neves ME (pintura)	Contrato 30/2022 – Pregão 306/2021	R\$ 3.227.162,33	FUNDEB + próprio
TOTAL 2022	-	R\$ 13.849.897,76	-
2021			
Engemitsu Eng. e Construções LTDA	Contrato 256/2018 – Pregão 141/2018	R\$ 5.457.094,49	FUNDEB + próprio + federal
Operattus Construções Cíveis (pisos)	Contrato 194/2021 – Pregão 308/2021	R\$ 3.261.458,90	Próprio
Eduardo Vinícius Neves Me (pintura)	Contrato 30/2022 – Pregão 306/2021	R\$ 0,00	-
TOTAL 2021	-	R\$ 8.718.553,39	-
2020			
Engemitsu Eng. e Construções LTDA	Contrato 256/2018 – Pregão 141/2018	R\$ 5.592.489,63	FUNDEB + próprio + federal
TOTAL 2020	-	R\$ 5.592.489,63	-
2019			
Engemitsu Eng. e Construções LTDA	Contrato 256/2018 – Pregão 141/2018	R\$ 5.387.599,91	FUNDEB + próprio + federal
TOTAL 2019	-	R\$ 5.387.599,91	-
2018			
Engemitsu Eng. e Construções LTDA	Contrato 256/2018 – Pregão 141/2018	R\$ 1.635.558,17	FUNDEB + próprio
TOTAL 2018	-	R\$ 1.635.558,17	-
2017			
Clopcons Construções LTDA- ME	Contrato 71/2016 – Pregão 009/2016	R\$ 3.011.532,28	FUNDEB + próprio
TOTAL 2017	-	R\$ 3.011.532,28	-
TOTAL 2017-2022	-	R\$ 38.195.631,14	-

SME – Quantidade de obras, por tipo e região – 2023 a 2025

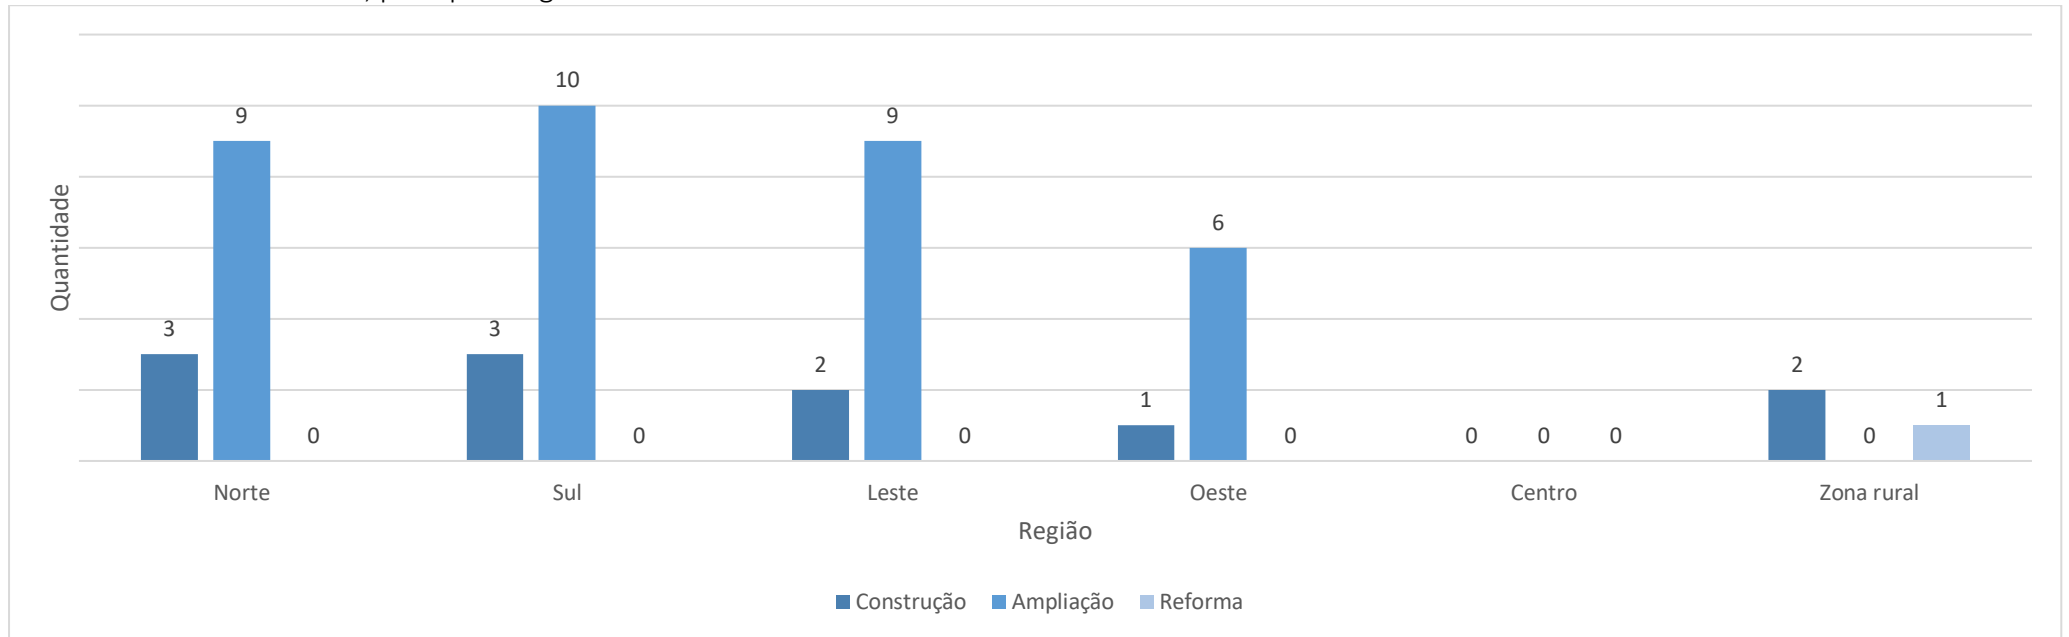


CADERNO DE AÇÕES E OBRAS 2026 – 2023-2025


SME – Valor de obras, por tipo e região – 2023 a 2025

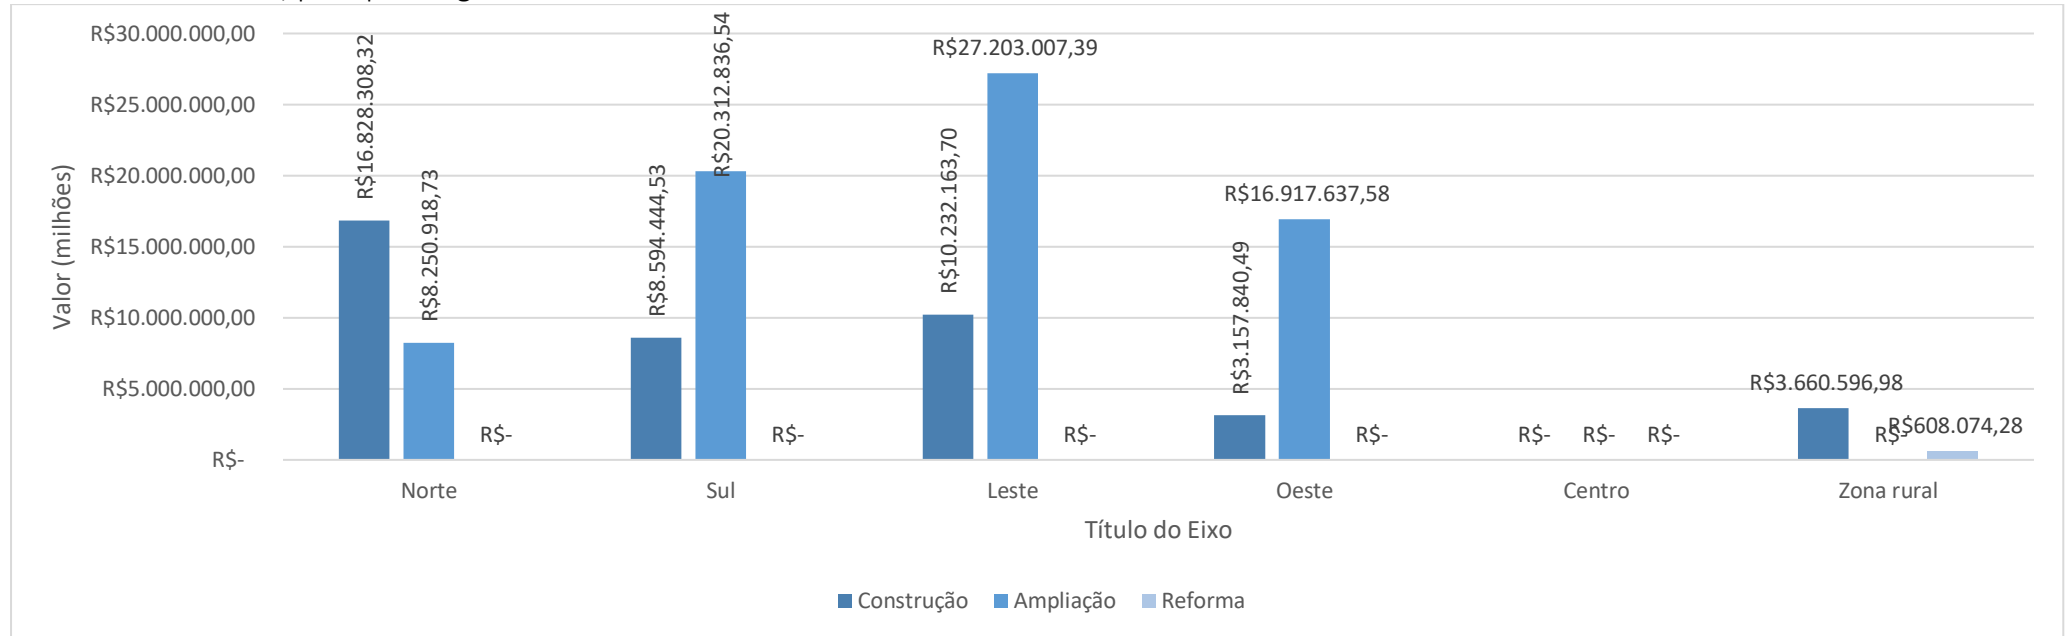

SME – Quantidade de obras, por status e região – 2023 a 2025

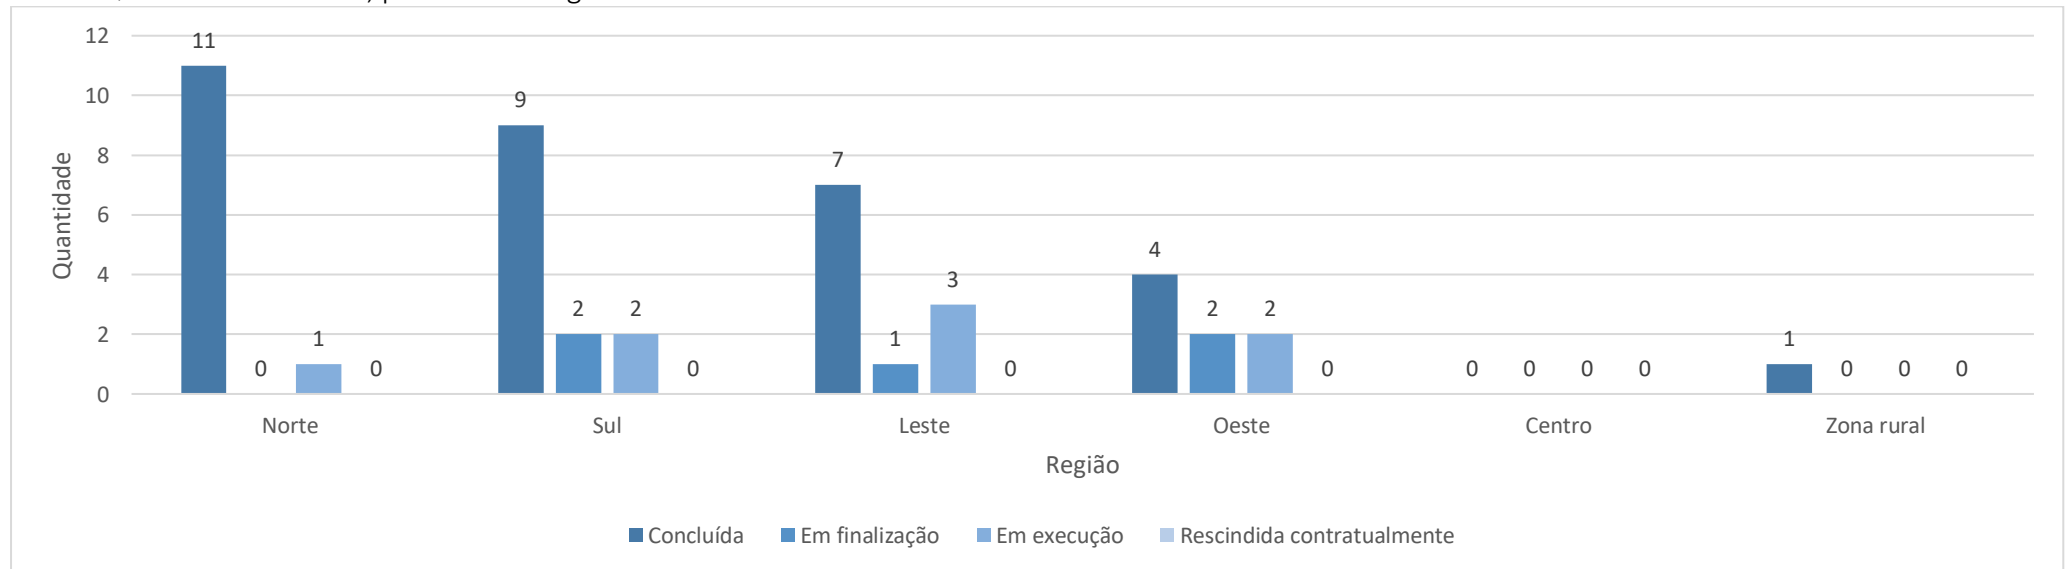

SME – Valor de obras, por status e região – 2023 a 2025

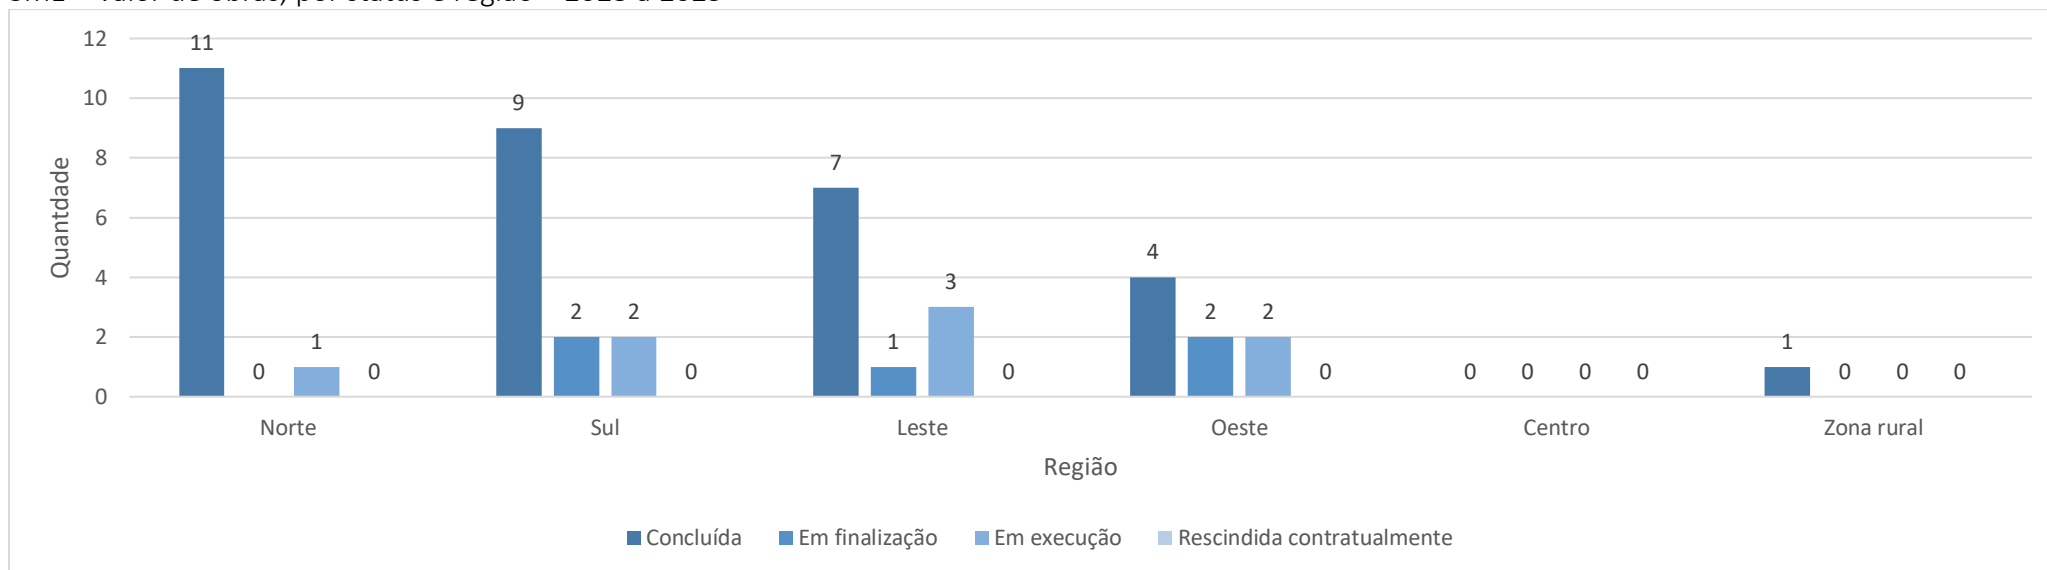

Fonte: PML/Secretaria Municipal de Educação – SME (2026).

Organização dos dados: PML/SMPOT/DP/Gerência de Pesquisas e Informações.
