

Autarquia Municipal de Saúde – AMS

AMS – Unidades Básicas de Saúde – Construção – 2023 a 2025

UBS's	Região(ões)	Quantidade	Valor (R\$)			Origem do recurso	Data de início	Data de conclusão ou previsão de	Status em 31/12/2025
			Vinculado	Próprio	Total				
UBS Fraternidade	Centro	1	R\$ -	R\$ 1.473.173,53	R\$ 1.473.173,53	Próprio	24/08/2022	30/05/2023	Obra concluída
UBS Pac Região Leste	Leste	1	R\$ 2.783.622,00	R\$ 2.202.278,00	R\$ 4.985.900,00	Federal + Próprio		02/12/2027	Licitando
UBS Pac Região Oeste	Oeste	1	R\$ 2.783.622,00	R\$ 2.336.278,00	R\$ 5.119.900,00	Federal + Próprio		02/12/2027	Licitando
UBS Parigot	Norte	1	R\$ 1.350.000,00	R\$ 1.761.316,55	R\$ 3.111.316,55	Estadual + Próprio	-	-	Documentação técnica para análise da SESA
UBS Jardim Dos Pássaros	Norte	1	R\$ 1.350.000,00	-	-	Estadual + Próprio	-	-	Projetos de implantação
UBS São Jorge	Norte	1	R\$ 1.350.000,00	-	-	Estadual + Próprio	-	-	Projetos de implantação
UBS Eli Vive (Apoio Rural)	Rural	1	R\$ 250.000,00	-	-	Estadual + Próprio	-	-	Elaboração de projetos
UBS Bandeirantes	Oeste	1	R\$ 1.350.000,00	-	-	Estadual + Próprio	-	-	Terreno
Total	-	8	R\$ 11.217.244,00	R\$ 7.773.046,08	R\$ 14.690.290,08	-	-	-	-

CADERNO DE AÇÕES E OBRAS 2026 – 2023-2025

AMS – Unidades Básicas de Saúde – Ampliação e reforma – 2023 a 2025

UBS's	Região(ões)	Quantidade	Valor (R\$)			Origem do recurso	Data de início	Data de conclusão ou previsão de	Status em 31/12/2025
			Vinculado	Próprio	Total				
UBS Pind	Sul	1	R\$ 800.000,00	-	-	Estadual + Próprio	-	-	Licitação de projetos
UBS Marabá	Leste	1	R\$ 800.000,00	-	-	Estadual + Próprio	-	-	Documentação de habilitação em análise pela SESA
UBS Santiago	Oeste	1	R\$ 500.000,00	-	-	Estadual + Próprio	-	-	Documentação de habilitação em análise pela SESA
UBS Irerê	Rural	1	-	R\$ 1.343.501,23	R\$ 1.343.501,23	Próprio	02/10/2025	08/07/2026	Em andamento
Total	-	4	R\$ 2.342.927,26	R\$ 2.411.174,63	R\$ 2.954.101,89	-	-	-	-

Nota: 1. Montante final considerando acréscimos e supressões ao valor contratual, que foram pagos integralmente com recursos vinculados.

AMS – Unidades Básicas de Saúde – Reforma e reparo estrutural – 2023 a 2025

UBS's	Região(ões)	Quantidade	Valor (R\$)			Origem do recurso	Data de início	Data de conclusão ou previsão de	Status em 31/12/2025
			Vinculado	Próprio	Total				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CADERNO DE AÇÕES E OBRAS 2026 – 2023-2025

AMS – Unidades Básicas de Saúde – Reforma – 2023 a 2025

UBS's	Região(ões)	Quantidade	Valor (R\$)			Origem do recurso	Data de início	Data de conclusão ou previsão de	Status em 31/12/2025
			Vinculado	Próprio	Total				
UBS AQUILES	Norte	1	-	-	-	-	-	-	Cancelada. Recurso devolvido em 2024
UBS ARMINDO GUAZZI	Leste	1	-	-	-	-	-	-	Cancelada. Recurso devolvido em 2024
UBS BANDEIRANTES	Oeste	1	-	-	-	-	-	-	Cancelada. Recurso devolvido em 2024
UBS CHEFE NEWTON	Norte	1	-	R\$ 468.375,54	R\$ 468.375,54	Próprio	21/12/2023	23/05/2024	Obra concluída
UBS GUARAVERA	Rural	1	-	R\$ 321.328,01	R\$ 321.328,01	Próprio	14/11/2023	25/10/2024	Obra concluída
UBS IRERÊ	Rural	1	-	-	-	-	-	-	Cancelada. Recurso devolvido em 2024
UBS PADOVANI	Norte	1	-	-	-	-	14/05/2025	-	Cancelada. Recurso devolvido em 2024
UBS VILA RICARDO	Leste	1	-	R\$ 953.867,23	R\$ 953.867,23	Próprio	14/05/2025	10/08/2026	Em andamento
UBS UNIÃO DA VITÓRIA	Sul	1	-	-	-	-	--	-	Cancelada. Recurso devolvido em 2024
UBS PARIGOT	Norte	1	-	-	-	-	-	-	Cancelada. Recurso devolvido em 2025
UBS LERROVILLE**	Rural	1	R\$ 150.000,00	R\$ 243.491,81	R\$ 393.491,81	Estadual + Próprio	17/11/2021	29/08/2022	Obra concluída
UBS VILA BRASIL**	Centro	1	R\$ 150.000,00	R\$ 116.418,00	R\$ 266.418,00	Estadual + Próprio	17/11/2021	17/03/2022	Obra concluída
UBS VIVI XAVIER**	Norte	1	R\$ 242.927,26	R\$ 307.694,04	R\$ 550.621,30	Estadual + Federal + Próprio	17/11/2021	16/04/2022	Obra concluída
UBS BANDEIRANTES	Norte	1	R\$ 300.000,00	-	-	Estadual + Próprio	-	-	Documentação técnica para análise da SESA
UBS OURO BRANCO	Sul	1	R\$ 300.000,00	-	-	Estadual + Próprio	-	-	Documentação técnica para análise da SESA
UBS PANISSA	Oeste	1	R\$ 300.000,00	-	-	Estadual + Próprio	-	-	Documentação técnica para análise da SESA
UBS GAVETTI	Norte	1	R\$ 300.000,00	-	-	Estadual + Próprio	-	-	Documentação técnica para análise da SESA
UBS NOVO AMPARO	Leste	1	R\$ 300.000,00	-	-	Estadual + Próprio	-	-	Documentação técnica para análise da SESA
UBS PADOVANI	Norte	1	R\$ 300.000,00	-	-	Estadual + Próprio	-	-	Documentação técnica para análise da SESA
Total	-	19	R\$ 2.342.927,26	R\$ 2.411.174,63	R\$ 2.954.101,89	-	-	-	-

Nota: 1. Obras foram paralisadas – houve nova licitação. Data de início = data da retomada.

* Montante final considerando acréscimos e supressões ao valor contratual, que foram pagos integralmente com recursos vinculados.

** Obras foram paralisadas- houve nova licitação. Data de início = data da retomada.

CADERNO DE AÇÕES E OBRAS 2026 – 2023-2025

AMS – Outras obras – Construção – 2023 a 2025

Outras obras	Região(ões)	Quantidade	Valor (R\$)			Origem do recurso	Data de início	Data de conclusão ou previsão de	Status em 31/12/2022
			Vinculado	Próprio	Total				
PAM LESTE	Leste	1	R\$ 3.500.000,00	R\$ 3.500.132,76	R\$ 7.000.132,76	Estadual + Próprio	04/01/2024	10/10/2026	Em andamento
PAM NORTE	Norte	1	R\$ 3.476.147,02	R\$ 2.629.283,59	R\$ 6.105.430,61	Estadual + Próprio	03/01/2024	10/10/2026	Em andamento
PAM SUL	Sul	1	R\$ 3.476.508,99	R\$ 2.159.017,76	R\$ 5.635.526,75	Estadual + Próprio	04/01/2024	10/10/2026	Em andamento
PAM CINCO CONJUNTOS	Norte	1	R\$ 5.500.000,00			Estadual + Próprio			Documentação técnica para análise da SESA
ACADEMIA DA SAÚDE	Leste	1		R\$ 377.500,00	R\$ 377.500,00	Próprio			Licitação
Total	-	5	R\$ 15.952.656,01	R\$ 8.665.934,11	R\$ 19.118.590,12	-	-	-	-

AMS – Outras obras – Ampliação e reforma – 2023 a 2025

Outras obras	Região(ões)	Quantidade	Valor (R\$)			Origem do recurso	Data de início	Data de conclusão ou previsão de	Status em 31/12/2022
			Vinculado	Próprio	Total				
MATERNIDADE MUNICIPAL	Centro	1	R\$ 2.373.646,00	R\$ 4.937.647,22	R\$ 7.311.293,22	Federal + Próprio	19/08/2019	12/05/2023	Obra concluída
SEDE REGIONAL SAMU	Centro	1	R\$ 4.516.212,12	R\$ 1.118.547,16	R\$ 5.634.759,28	Estadual + Próprio	13/07/2020	24/03/2023	Obra concluída
CAPS III- ALTO DA BOA VISTA	Norte	1	R\$ 7.000.000,00	R\$ 1.106.672,48	R\$ 8.106.672,48	Estadual + Próprio	-	-	Licitação
Total	-	3	R\$ 6.889.858,12	R\$ 6.056.194,38	R\$ 12.946.052,50	-	-	-	-

AMS – Outras obras – Reforma e reparo estrutural – 2023 a 2025


Outras obras	Região(ões)	Quantidade	Valor (R\$)			Origem do recurso	Data de início	Data de conclusão ou previsão de	Status em 31/12/2022
			Vinculado	Próprio	Total				
UPA CENTRO OESTE	Centro-oeste	1	-	R\$ 1.836.944,28	R\$ 1.836.944,28	-	04/07/2025	20/04/2026	Em andamento
Total	-	1	R\$ -	R\$ 1.836.944,28	R\$ 1.836.944,28	-	-	-	-

CADERNO DE AÇÕES E OBRAS 2026 – 2023-2025


AMS – Outras obras – Reforma – 2023 a 2025

Outras obras	Região(ões)	Quantidade	Valor (R\$)			Origem do recurso	Data de início	Data de conclusão ou previsão de	Status em 31/12/2025
			Vinculado	Próprio	Total				
UPA CENTRO OESTE	CENTRO OESTE	1	R\$ 5.000.000,00	R\$ 1.036.741,30	R\$ 6.036.741,30	Estadual + Próprio			Instrução de processo (habilitação e engenharia), para encaminhar para a SESA.
Total	-	2	R\$ 5.000.000,00	R\$ 1.036.741,30	R\$ 6.036.741,30	-	-	-	-


AMS – Quantidade de obras, por tipo e região – 2023 a 2025

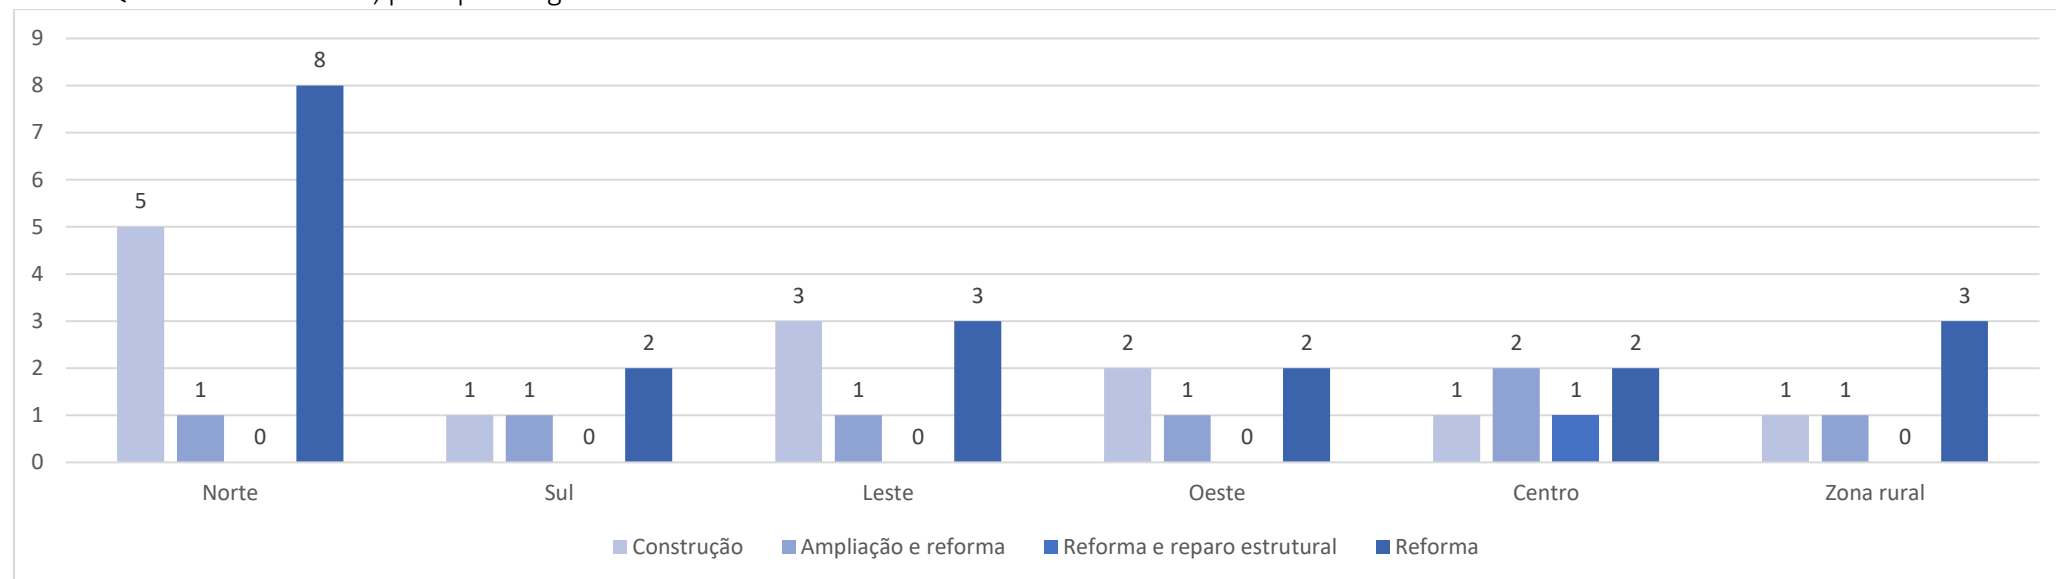


AMS – Valor de obras, por tipo e região – 2023 a 2025

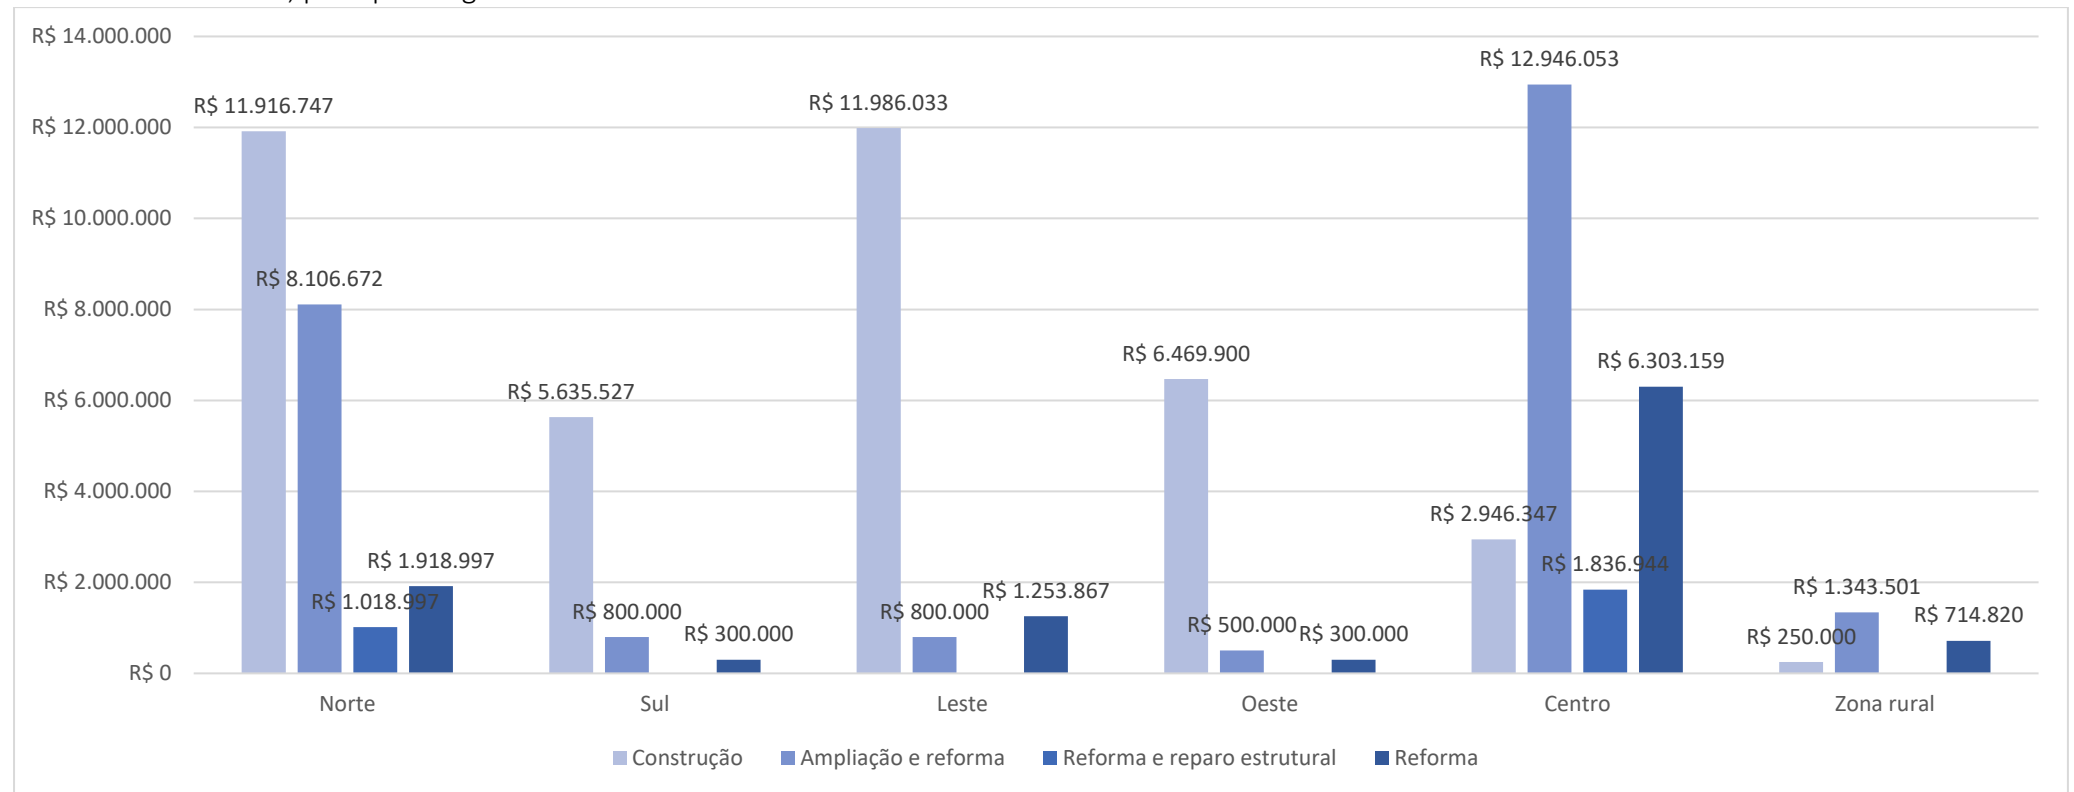

AMS – Quantidade de obras, por status e região – 2023 a 2025

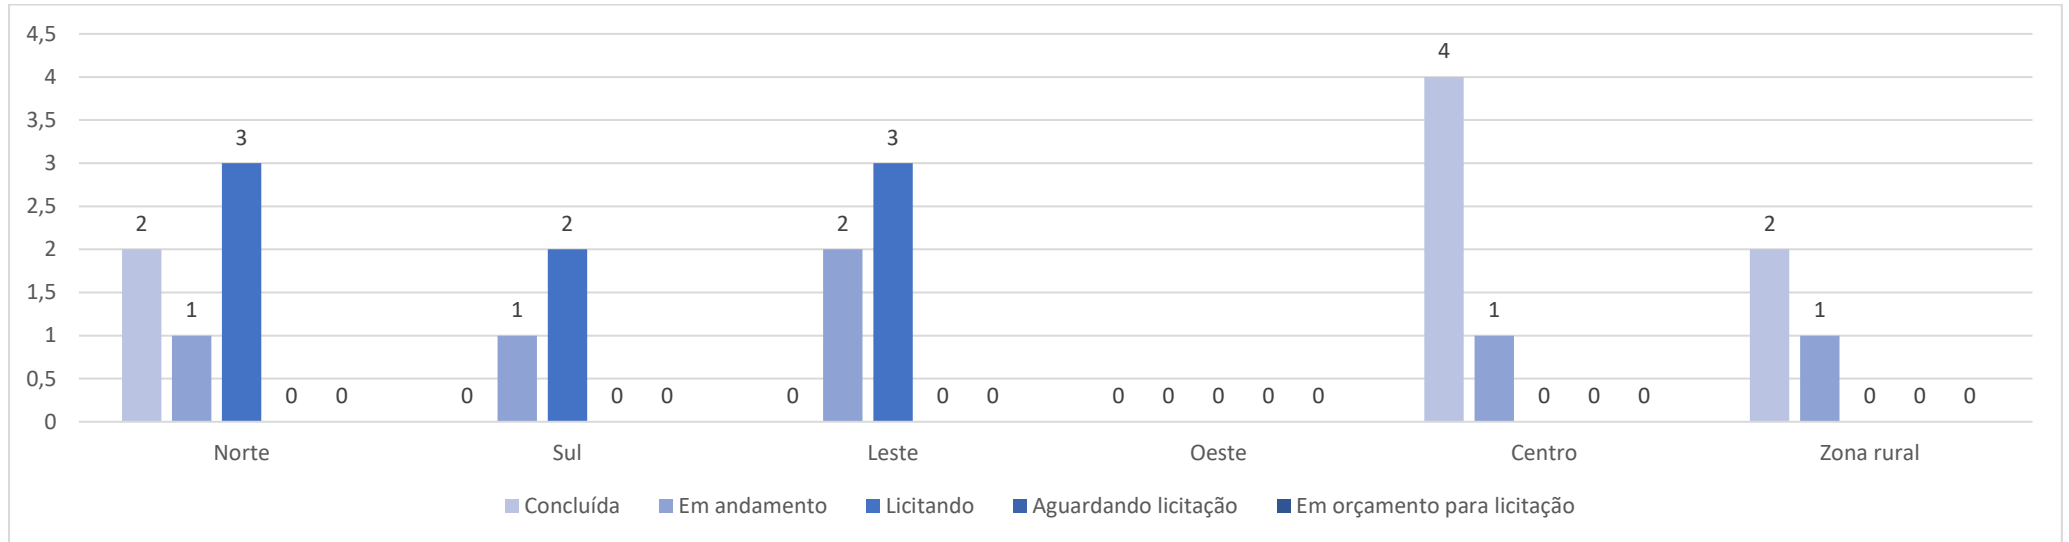

AMS – Valor de obras, por status e região – 2023 a 2025

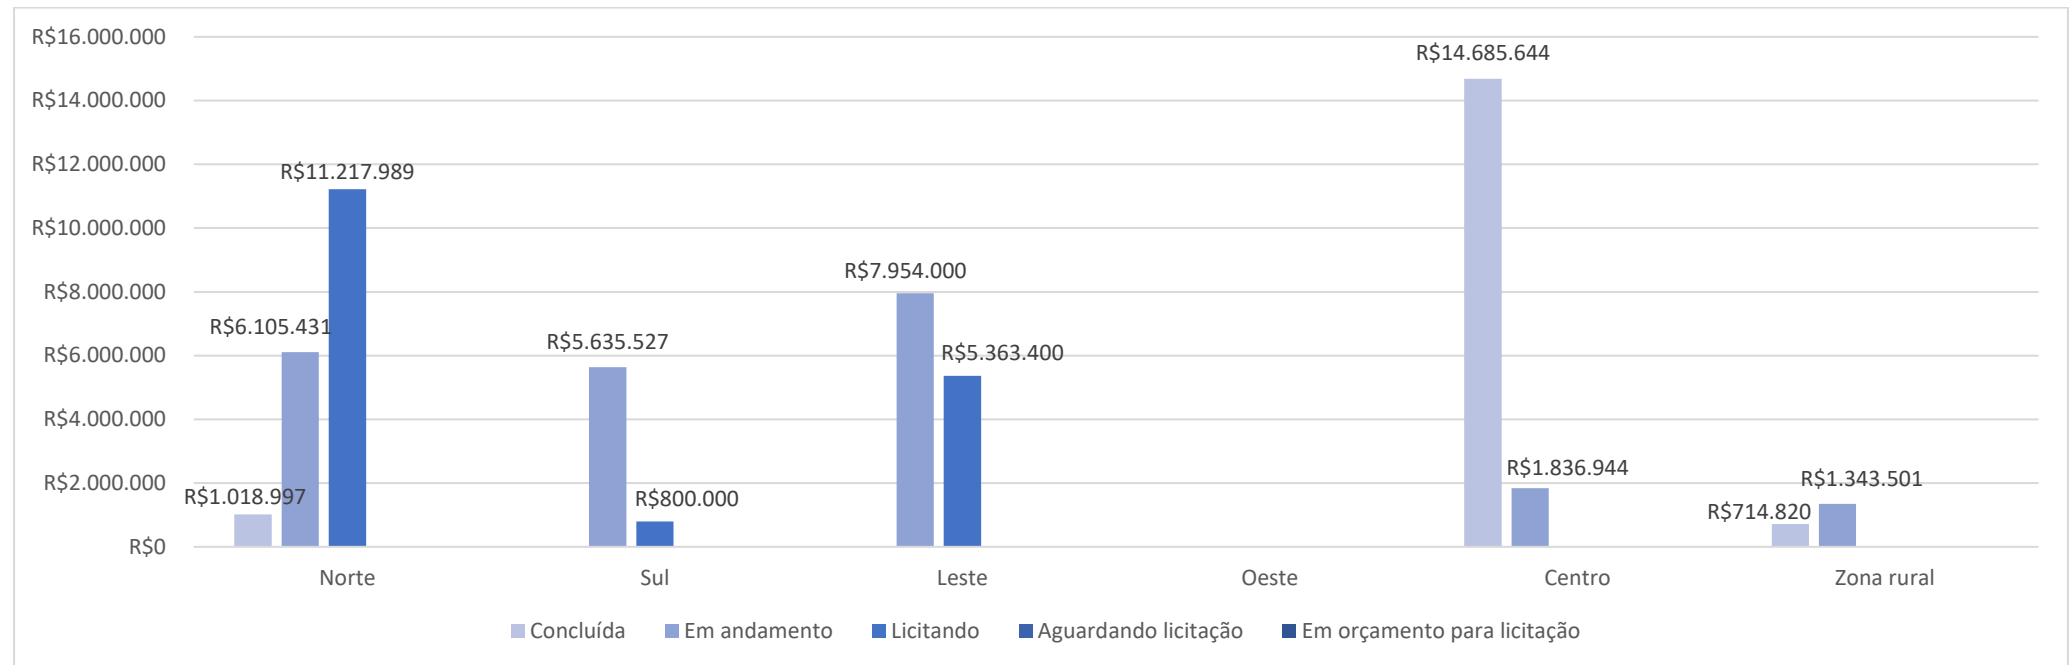

Fonte: PML/Autarquia Municipal de Saúde – AMS (2026).

Organização dos dados: Organização dos dados: PML/SMPOT/DP/Gerência de Pesquisas e Informações.
