

Secretaria Municipal de Obras e Pavimentação – SMOP

SMOP – Edificações Públicas – 2017 a 2023¹

Obras	Região(ões)	Edital	Quantidade (unidade)	Quantidade	Unidade	Valor (R\$)			Origem do recurso	Data de início	Data de conclusão ou previsão de	Status em dez/2023
						Vinculado	Próprio	Total				
Reforma da Caapsml	Centro	CP/SMGP 0011/2016	1	4.034,93	m ²	R\$ -	R\$ 6.144.683,88	R\$ 6.144.683,88	Próprio	20/01/2017	24/01/2019	Concluída
Execução de Poços de Monitoramento de Lençol Freático	Diversas	CP/SMGP 0002/2016	10	10	un.	R\$ -	R\$ 70.344,40	R\$ 70.344,40	Próprio	14/06/2017	14/09/2017	Concluída
Recuperação do Campo de Futebol na Rua Tangânica	Norte	TP/SMGP 004/2017	1	7.888,47	m ²	R\$ 172.217,54	R\$ 1.751,78	R\$ 173.969,32	Federal + próprio	22/06/2017	23/10/2017	Concluída
Construção do Centro de Convivência da Pessoa Idosa - CCI Norte	Norte	CP/SMGP 019/2016	1	676,75	m ²	R\$ 1.433.607,68	R\$ -	R\$ 1.433.607,68	Privado/FMDI	21/08/2017	18/01/2019	Concluída
Conclusão da Obra de Reforma do Ginásio de Esportes Prof. Darci Cortes (Moringão)	Centro	TP/SMGP 005/2017	1	8.410,97	m ²	R\$ 42.090,27	R\$ 8.864,00	R\$ 50.954,27	Federal + próprio	03/04/2018	02/11/2018	Concluída
Implantação do Tecnocentro	Norte	CP/SMGP 0010/2017	1	3.144,93	m ²	R\$ -	R\$ 69.217,45	R\$ 69.217,45	Próprio	13/04/2018	29/01/2019	Concluída
Execução de Obra para as Escadarias do Tecnocentro	Norte	CP/SMGP 0009/2017	1	35,99	m ²	R\$ -	R\$ 39.931,45	R\$ 39.931,45	Próprio	24/04/2018	27/11/2018	Concluída
Impermeabilização de Laje da Rampa de Lançamento da Pista de Bicycross no Autódromo de Londrina	Norte	CP/SMGP 0001/2018	1	509,49	m ²	R\$ 29.767,65	R\$ 39.232,33	R\$ 68.999,98	Federal + próprio	09/05/2018	08/08/2018	Concluída

continua

CADERNO DE AÇÕES E OBRAS 2023 – 2017-2022

SMOP – Edificações Públicas – 2017 a 2023¹

continuação

Obras	Região(ões)	Edital	Quantidade (unidade)	Quantidade	Unidade	Valor (R\$)			Origem do recurso	Data de início	Data de conclusão ou previsão de	Status em dez/2023
						Vinculado	Próprio	Total				
Adequação Viária com Interseção em Desnível- Av. Dez de Dezembro x Av. Leste-Oeste	Centro	CP/SMGP 0007/2017	1	21.785,98	m ²	R\$ 15.624.303,23	R\$ 2.795.407,37	R\$ 18.419.710,60	Federal + próprio	24/08/2018	29/10/2020	Concluída
Recuperação Ambiental do Fundo de Vale do Ribeirão Lindóia- Lote 1	Norte	CP/SMGP 0004/2018	1	819,87	m ²	R\$ 215.033,05	R\$ -	R\$ 215.033,05	Federal	24/08/2018	11/01/2019	Concluída
Conclusão das Unidades Habitacionais do Residencial Horizonte 2	Norte	CP/SMGP 0011/2018	1	2.727,83	m ²	R\$ 300.718,67	R\$ -	R\$ 300.718,67	Federal	09/01/2019	10/09/2019	Concluída
Execução de Poços de Monitoramento de Lençol Freático	Zona rural	CP/SMGP 0022/2018	16	16	un.	R\$ -	R\$ 102.194,88	R\$ 102.194,88	Próprio ACESF	17/04/2019	08/09/2020	Concluída
Reconstrução do Terminal Urbano Vivi Xavier	Norte	CP/SMGP 0002/2019	1	2.951,18	m ²	R\$ 4.513.295,43	R\$ 803.950,30	R\$ 5.317.245,73	Federal + próprio	13/05/2019	26/03/2021	Concluída
Recuperação e Adequação do Museu de Arte de Londrina	Centro	CP/SMGP 0019/2018	1	1.495,97	m ²	R\$ -	R\$ 1.213.036,50	R\$ 1.213.036,50	Próprio	11/06/2019	13/03/2020	Concluída
Execução de Fechamento e Adequações no Passeio (calçada) do Cemitério João XXIII	Centro	TP/SMGP 001/2019	1	646,94	metro linear	R\$ -	R\$ 652.531,18	R\$ 652.531,18	Próprio ACESF	02/07/2019	18/02/2020	Concluída
Substituição do Telhado da Biblioteca Municipal e do Teatro Zaquero de Melo	Centro	TP/SMGP 0009/2018	1	744,09	m ²	R\$ -	R\$ 308.177,08	R\$ 308.177,08	Próprio	25/05/2019	22/01/2020	Concluída

continua

CADERNO DE AÇÕES E OBRAS 2023 – 2017-2022

SMOP – Edificações Públicas – 2017 a 2023¹

continuação

Obras	Região(ões)	Edital	Quantidade (unidade)	Quantidade	Unidade	Valor (R\$)			Origem do recurso	Data de início	Data de conclusão ou previsão de	Status em dez/2023
						Vinculado	Próprio	Total				
Revitalização de Calçadas, Mobiliário Urbano, Iluminação Ornamental e Paisagismo- Rua Sergipe	Centro	TP/SMGP 0002/2019	1	1.250,00	metro linear	R\$ -	R\$ 1.310.497,93	R\$ 1.310.497,93	Próprio	13/09/2019	08/04/2020	Concluída
Continuidade da Obra do Centro de Desenvolvimento Econômico-TECNOCENTRO	Norte	CP/SMGP 0012/2019	1	3.144,93	m ²	R\$ -	R\$ 2.728.983,22	R\$ 2.728.983,22	Próprio	28/10/2019	14/10/2021	Concluída
Reforma do Ginásio Bandeirantes	Oeste	TP/SMGP 0003/2019	1	1.594,52	m ²	R\$ 363.719,20	R\$ 3.687,24	R\$ 367.406,44	Federal + próprio	02/12/2019	22/07/2020	Concluída
Conclusão da Obra de Reforma do Ginásio de Esportes Moringão-Adequações Corpo de Bombeiros	Centro	CP/SMGP 0025/2019	1	7.056,00	m ²	R\$ 120.625,48	R\$ 25.180,00	R\$ 145.805,48	Federal + próprio	17/02/2020	04/08/2020	Concluída
Revitalização do Centro Esportivo Maria Cecília	Norte	TP/SMGP 0015/2019	1	13.205,08	m ²	R\$ -	R\$ 1.682.410,30	R\$ 1.682.410,30	Próprio	20/02/2020	24/09/2020	Concluída
Reconstrução do Terminal Urbano Milton Gavetti	Norte	CP SMGP 0036/2019	1	2.503,45	m ²	R\$ 5.047.905,54	R\$ 769.094,46	R\$ 5.817.000,00	Federal + próprio	05/03/2020	29/11/2021	Concluída
Revitalização do Entorno do Lago Igapó 2 (execução de calçadas)	Centro	CP/SMGP 0016/2019	1	5.614,52	m ²	R\$ -	R\$ 399.494,88	R\$ 399.494,88	Próprio	05/11/2020	04/02/2022	Concluída

continua

CADERNO DE AÇÕES E OBRAS 2023 – 2017-2022

SMOP – Edificações Públicas – 2017 a 2023¹

continuação

Obras	Região(ões)	Edital	Quantidade (unidade)	Quantidade	Unidade	Valor (R\$)			Origem do recurso	Data de início	Data de conclusão ou previsão de	Status em dez/2023
						Vinculado	Próprio	Total				
Execução do Campo de Futebol com Arquibancadas no C.H. Luiz de Sá	Norte	TP/SMGP 0004/2019	1	1.594,52	m ²	R\$ 426.033,34	R\$ 4.925,00	R\$ 449.098,56	Federal + próprio	05/06/2020	21/12/2021	Concluída
Expansão da iluminação pública no entorno do lago Cabrinha	Norte	SMGP-IN 106/2019	1	153	un.	R\$ -	R\$ 302.778,66	R\$ 302.778,66	Próprio	29/06/2020	04/08/2020	Concluída
Revitalização do Entorno do Lago Igapó 2- Serviços Complementares	Centro	TP/SMGP 0011/2020	1	8.475,00	m ²	R\$ -	R\$ 265.696,19	R\$ 265.696,19	Próprio	13/11/2020	28/11/2021	Concluída
Reforma do Ginásio do Centro Esportivo do Conjunto Maria Cecília	Norte	TP/SMGP 0012/2020	1	13.205,08	m ²	R\$ 18.732,15	R\$ 315.337,63	R\$ 334.069,78	Próprio + federal	01/12/2020	17/11/2021	Concluída
Implantação de Mini Quadra no CEPAS	Norte	CC/SMGP 0004/2020	1	472,00	m ²	R\$ 153.255,00	R\$ 9.368,74	R\$ 162.623,74	Federal + próprio	15/12/2020	18/06/2021	Concluída
Implantação Floreiras, Pintura Ciclovia, Adequação Ilhas de Trânsito- Entorno Lago Igapó 2	Centro	TP/SMGP 0015/2020	1	1.826,00	m	R\$ -	R\$ 650.166,69	R\$ 650.166,69	Próprio	29/01/2021	23/09/2021	Concluída
Revitalização do Bosque Central (Marechal Cândido Rondon)	Centro	TP/SMGP 0016/2020	1	26.080,47	m ²	R\$ -	R\$ 2.833.965,32	R\$ 2.833.965,32	Próprio	08/02/2021	10/01/2021	Concluída
Execução de Pista de Skate no Distrito São Luiz (Lote 02)	Zona rural	TP/SMGP 0013/2020	1	208,16	m ²	R\$ 73.389,06	R\$ -	R\$ 73.389,06	Federal	26/02/2021	22/07/2021	Concluída

continua

CADERNO DE AÇÕES E OBRAS 2023 – 2017-2022

SMOP – Edificações Públicas – 2017 a 2023¹

continuação

Obras	Região(ões)	Edital	Quantidade (unidade)	Quantidade	Unidade	Valor (R\$)			Origem do recurso	Data de início	Data de conclusão ou previsão de	Status em dez/2023
						Vinculado	Próprio	Total				
Execução de Pista de Skate no Jardim da Luz (Lote 01)	Leste	TP/SMGP 0013/2020	1	260,60	m ²	R\$ 151.436,24	R\$ -	R\$ 151.436,24	Federal	26/02/2021	22/07/2021	Concluída
Expansão da iluminação pública Avenida Faria Lima trecho II	Oeste	SMGP 0029/2021	1	86	un.	R\$ 254.685,79	R\$ -	R\$ 254.685,79	Federal	30/03/2021	14/06/2021	Concluída
Modernização da iluminação pública do município segunda fase	Diversas	IN/SMGP 0002/2021	1	34.306	un.	R\$ 62.600.076,04	R\$ -	R\$ 62.600.076,04	Vinculado BRDE	05/04/2021	18/06/2024	Em andamento
Modernização da iluminação pública ornamental do município segunda fase	Diversas	IN/SMGP 0002/2021	1	2.656	un.	R\$ 5.592.812,64	R\$ -	R\$ 5.592.812,64	Vinculado BRDE	05/04/2021	29/06/2022	Em andamento
Instalação de Equipamento de Ar Condicionado para o Tecnocentro e Laboratório de Alimentos	Leste	CP/SMGP 014/2020	1	3.144,93	m ²	R\$ -	R\$ 932.196,65	R\$ 932.196,65	Próprio	21/05/2021	14/04/2022	Concluída
Expansão e modernização da iluminação pública do bosque central	Centro	SMGP 0056/2021	1	105	un.	R\$ -	R\$ 383.409,25	R\$ 383.409,25	Próprio	02/07/2021	29/12/2021	Concluída
Substituição de Calçada na Rua Gago Coutinho (Torre de Transmissão COPEL)	Leste	SMGP 082/2021	1	103,68	m ²	R\$ -	R\$ 16.654,48	R\$ 16.654,48	Próprio	11/08/2021	24/09/2021	Concluída
Instalação de Trecho de Guarda-corpo na Rua da Canoagem	Centro	SMGP 093/2021	1	55,36	m	R\$ 57.073,17	R\$ -	R\$ 57.073,17	Federal	26/08/2021	28/10/2021	Concluída

continua

CADERNO DE AÇÕES E OBRAS 2023 – 2017-2022

SMOP – Edificações Públicas – 2017 a 2023¹

continuação

Obras	Região(ões)	Edital	Quantidade (unidade)	Quantidade	Unidade	Valor (R\$)			Origem do recurso	Data de início	Data de conclusão ou previsão de	Status em dez/2023
						Vinculado	Próprio	Total				
Instalação de Calçadas nas ruas Café Solúvel e Café Supremo	Norte	SMGP 109/2021	1	523,58	m ²	R\$ -	R\$ 17.432,11	R\$ 17.432,11	Próprio	13/09/2021	03/11/2021	Concluída
Instalação de Calçadas na Praça Jd. San Diego- Coliseo	Norte	SMGP 114/2021	1	185,29	m ²	R\$ -	R\$ 28.998,04	R\$ 28.998,04	Próprio	20/09/2021	25/11/2021	Concluída
Reforma do Ginásio Moringão e FEL- Elétrica, Ar Condicionado, Cobertura, Pintura	Centro	SMGP 096/2021	1	10.275,99	m ²	R\$ 3.871.636,15	R\$ 3.340.583,11	R\$ 7.212.219,26	Federal + próprio	13/10/2021	25/07/2023	Concluída
Construção de Ciclovia em Concreto Pigmentado e Urbanização de Área Verde- Rua José Giroldo	Centro	CP/SMGP 010/2021	1	1.145,00	m ²	R\$ -	R\$ 513.867,00	R\$ 513.867,00	Próprio	11/11/2021	04/08/2022	Concluída
Execução de Calçada e Implantação de Acessibilidade na Praça Adelino Vidotti	Sul	SMGP 131/2021	1	647,43	m ²	R\$ 60.572,94	R\$ -	R\$ 60.572,94	Federal	12/11/2021	11/01/2021	Concluída
Implantação de Acessibilidade na Praça Guilherme Soares	Centro	SMGP 133/2021	1	114,43	m ²	R\$ -	R\$ 13.234,68	R\$ 13.234,68	Próprio	12/11/2021	13/01/2021	Concluída
Expansão da iluminação pública ornamental do município de Londrina	Diversas	SMGP 047/2021	1	215	un.	R\$ -	R\$ 1.292.205,00	R\$ 1.292.205,00	Próprio	02/12/2021	02/12/2022	Em andamento

continua

CADERNO DE AÇÕES E OBRAS 2023 – 2017-2022

SMOP – Edificações Públicas – 2017 a 2023¹

continuação

Obras	Região(ões)	Edital	Quantidade (unidade)	Quantidade	Unidade	Valor (R\$)			Origem do recurso	Data de início	Data de conclusão ou previsão de	Status em dez/2023
						Vinculado	Próprio	Total				
Execução de Calçada e Implantação de Acessibilidade na Praça Prefeito Goichi	Centro	SMGP 163/2021	1	368,47	m ²	R\$ -	R\$ 41.242,16	R\$ 41.242,16	Próprio	08/12/2021	15/03/2022	Concluída
Execução das obras de Revitalização da Praça Dom Pedro I	Oeste	TP/SMGP 022/2022	1	7.723,25	m ²	R\$ 801.464,86	R\$ -	R\$ 801.464,86	Federal	15/03/2022	10/08/2022	Concluída
Reforma da Arquibancada do Estádio do Café para Adequação da Acessibilidade	Norte	TP/SMGP 004/2022	1	352,98	m ²	R\$ 477.500,00	R\$ 40.047,14	R\$ 517.547,14	Próprio + federal	30/06/2022	03/11/2022	Concluída
Reconstrução do Terminal Urbano Ouro Verde	Norte	CP/SMGP 005/2022	1	3.944,88	m ²	R\$ 11.926.863,71	R\$ 683.487,37	R\$ 12.610.351,08	Próprio + federal	12/07/2022	10/10/2023	Em andamento
Praça José Bonifácio e Silva	Sul	TP/SMGP 005/2022	1	3.073,09	m ²	R\$ 498.161,63	R\$ -	R\$ 498.161,63	Federal	03/08/2022	27/02/2023	Concluída
Revitalização Aterro Igapó	Sul	CP/SMGP 003/2022	1	6.252,93	m ²	R\$ 1.202.979,94	R\$ -	R\$ 1.202.979,94	Federal	08/08/2022	16/08/2023	Concluída
Reconstrução do Terminal Urbano Acapulco	Sul	CP/SMGP 008/2022	1	10.023,55	m ²	R\$ 10.854.395,13	R\$ 606.688,12	R\$ 11.461.083,25	Próprio + federal	09/08/2022	02/12/2023	Em andamento
EXECUÇÃO DE CICLOVIA NO CANTEIRO DA AVENIDA GUILHERME DE ALMEIDA	Sul	CP/SMGP 002/2022	1	3.192,89	m ²	R\$ 530.450,00	R\$ -	R\$ 530.450,00	Federal	10/08/2022	24/09/2023	Em andamento
Revitalização do Córrego do Barreiro- fase 01	Sul	TP/SMGP 005/2022	1	10.915,00	m ²	R\$ -	R\$ 618.700,00	R\$ 618.700,00	Próprio	06/09/2022	25/08/2023	Concluída
Reforma do Terminal Central	Centro	CP/SMGP 004/2022	1	14.995,16	m ²	R\$ 2.315.367,26	R\$ 38.600,00	R\$ 2.353.967,26	Federal + próprio	05/10/2022	19/10/2023	Concluída

continua


CADERNO DE AÇÕES E OBRAS 2023 – 2017-2022

SMOP – Edificações Públicas – 2017 a 2023¹

Obras	Região(ões)	Edital	Quantidade (unidade)	Quantidade	Unidade	Valor (R\$)			Origem do recurso	Data de início	Data de conclusão ou previsão de	Status em dez/2023
						Vinculado	Próprio	Total				
Execução das obras para o Campo de Futebol do Jardim São Marcos (Lote 01)	Sul	TP/SMGP 009/2022	1	5.297,31	m ²	R\$ -	R\$ 506.770,71	R\$ 506.770,71	Próprio	07/11/2022	28/09/2023	Concluída
Execução das obras para o Campo de Futebol do Jardim Vivi Xavier (Lote 02)	Norte	TP/SMGP 009/2022	1	4.046,79	m ²	R\$ -	R\$ 687.314,27	R\$ 687.314,27	Próprio	09/11/2022	04/07/2023	Concluída
Total	-	-	82	-	-	R\$129.730.168,79	R\$ 33.312.338,95	R\$163.060.647,96	-	-	-	-

Nota: 1. Recorte temporal estabelecido pela fonte.


SMOP – Edificações Públicas – Quantidade de obras, por status e região – 2017 a 2023¹

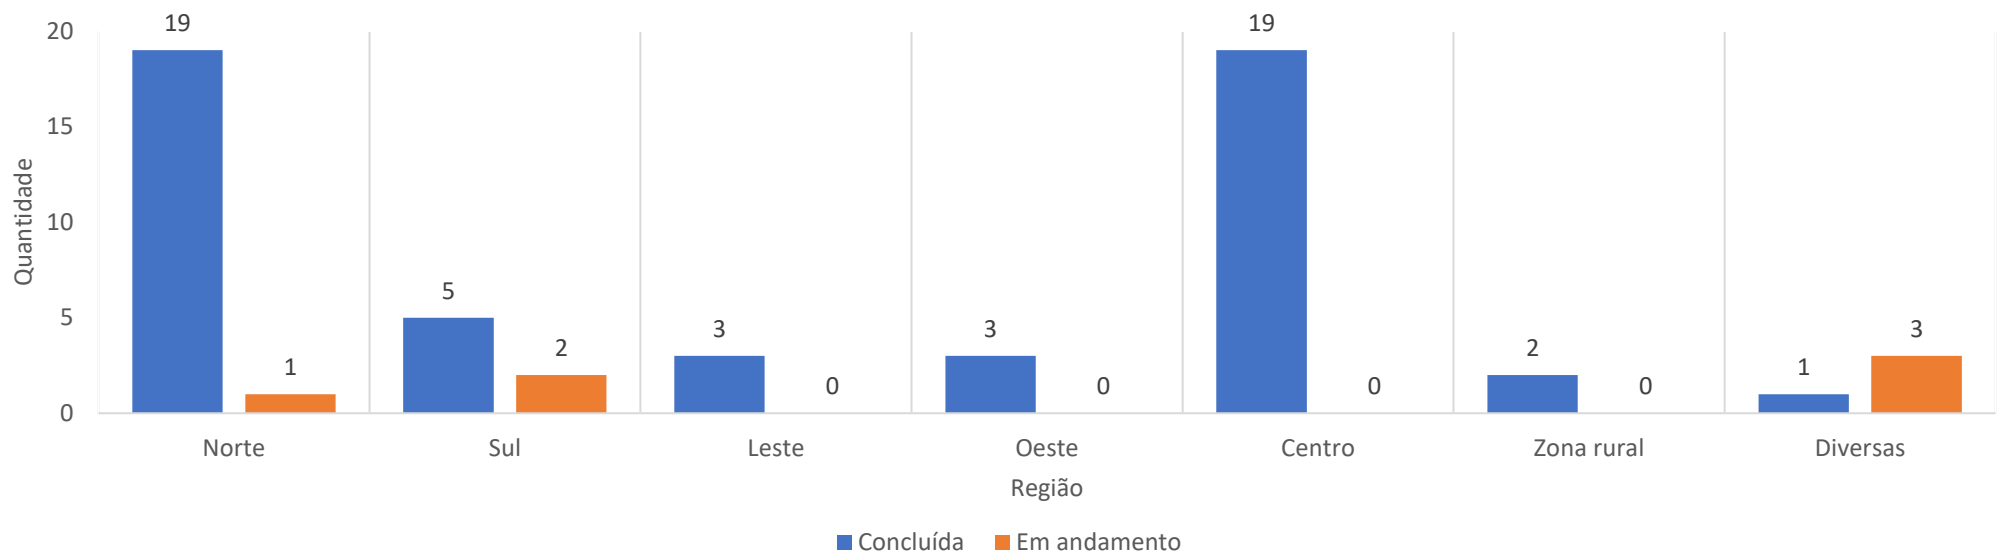

Nota: 1. Recorte temporal estabelecido pela fonte.

CADERNO DE AÇÕES E OBRAS 2023 – 2017-2022

SMOP – Edificações Públicas – Valor de obras, por status e região – 2017 a 2023¹

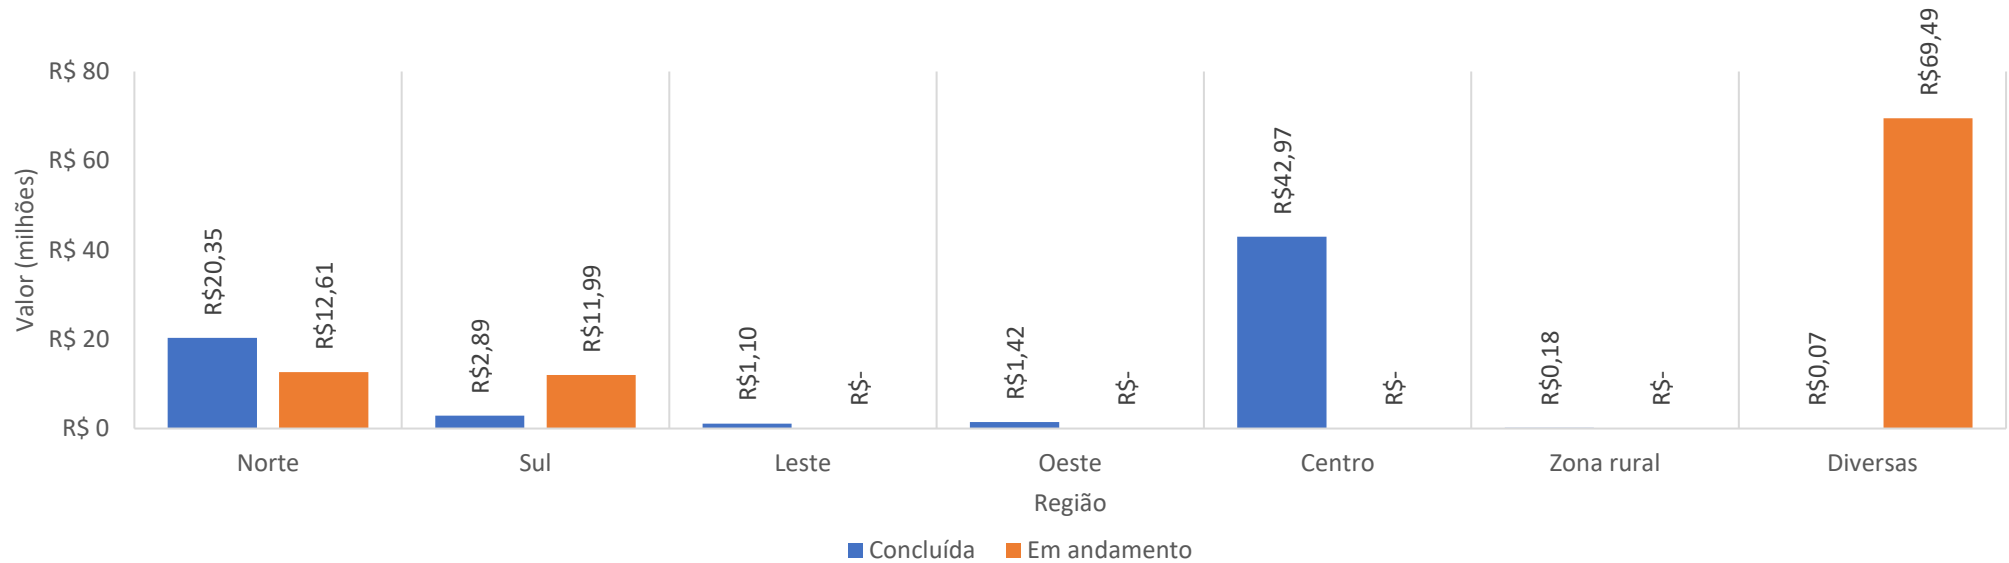

Nota: 1. Recorte temporal estabelecido pela fonte.

SMOP – Serviço Urbanos e Pavimentação – 2017 a 2023¹

Obras	Região(ões)	Edital	Quantidade (unidade)	Quantidade	Unidade	Valor (R\$)			Origem do recurso	Data de início	Data de conclusão ou previsão de	Status em 31/12/2023
						Vinculado	Próprio	Total				
Construção de pontes de concreto armado sobre os ribeirões Esperança, Cafezal e obras complementares na Rod. Mábio G. Palhano	Sul	SMGP 0055/2014	1	1.619,20	m ²	R\$ 1.679.157,16	R\$ 289.730,80	R\$ 1.968.887,96	Federal + próprio	23/06/2014	19/01/2018	Concluída
Execução de Revitalização da Av. Saul Elkind, no trecho compreendido entre a Av. Angelina Ricci Vezozzo e a Rod. Carlos João Strass	Norte	SMGP 273/2015	1	25.498,32	m ²	R\$ 1.965.218,24	R\$ -	R\$ 1.965.218,24	Estadual	10/11/2015	10/02/2017	Concluída

continua

CADERNO DE AÇÕES E OBRAS 2023 – 2017-2022

SMOP – Serviço Urbanos e Pavimentação – 2017 a 2023¹

continuação

Obras	Região(ões)	Edital	Quantidade (unidade)	Quantidade	Unidade	Valor (R\$)			Origem do recurso	Data de início	Data de conclusão ou previsão de	Status em 31/12/2023
						Vinculado	Próprio	Total				
Execução de Recapeamento Asfáltico em diversas vias com área de 113.271,36 m²	Diversas	SMGP 331/2015	1	113.271,3	m²	R\$ 4.327.462,31	R\$ -	R\$ 4.327.462,31	Estadual	11/01/2016	29/09/2017	Concluída
Drenagem e Pavimentação no Cemitério Jardim da Saudade	Norte	SMGP 0115/2016	1	1.769,50	m	R\$ -	R\$ 1.221.935,48	R\$ 1.221.935,48	Próprio	01/06/2016	14/03/2018	Concluída
Implantação e Adequação da Rodovia PR-445 e BR-369- Arco Leste Lote 04	Sul	SMGP 0012/2016	1	5.113,61	m²	R\$ 948.319,24	R\$ 83.582,69	R\$ 1.031.901,93	Federal + próprio	19/02/2016	13/03/2018	Concluída
Recapeamento asfáltico em diversas vias, com área de 104.749,96 m², em trechos de ruas e avenidas do Jardim Colonial, Parque Cana, Jardim Bela Vista, Jardim Lilian, Jardim Higienópolis, Vale do Cambezinho, Vila Santa Terezinha, Conjunto Habitacional Vivi Xavier, Portal do Sol, Jardim Esperança, Jardim Cristo Rei e Jardim Roveri	Diversas	SMGP 207/2016	1	104.749,9	m²	R\$ 4.071.484,48	R\$ -	R\$ 4.071.484,48	Estadual	23/06/2016	08/08/2017	Concluída

continua

CADERNO DE AÇÕES E OBRAS 2023 – 2017-2022

SMOP – Serviço Urbanos e Pavimentação – 2017 a 2023¹

continuação

Obras	Região(ões)	Edital	Quantidade (unidade)	Quantidade	Unidade	Valor (R\$)			Origem do recurso	Data de início	Data de conclusão ou previsão de	Status em 31/12/2023
						Vinculado	Próprio	Total				
Implantação e Adequação da Rodovia PR-445 e BR-369- Arco Leste Lote 05	Sul	SMGP 0013/2016	1	11.231,81	m ²	R\$ 3.017.547,79	R\$ 548.260,43	R\$ 3.565.808,22	Federal + próprio	28/09/2016	12/03/2018	Concluída
Reconstrução da Ponte sobre o Ribeirão Cafezal, na Rodovia Mabio Gonçalves Palhano	Sul	SMGP 0319/2016	1	525,00	m ²	R\$ 1.327.800,00	R\$ -	R\$ 1.327.800,00	Federal	06/12/2016	19/01/2018	Concluída
Lote- 03- Execução de Obra de Contenção- Recuperação de Encosta, na Rua Charles Lindemberg.	Sul	SMGP 0120/2017	1	948,00	m	R\$ -	R\$ 267.217,00	R\$ 267.217,00	Próprio	08/08/2017	04/12/2017	Concluída
Recuperação da Ruptura da Encosta da Ponte Vereador Amélio Viacelli	Sul	SMGP 242/2017	1	211,38	m ³	R\$ -	R\$ 277.218,12	R\$ 277.218,12	Próprio	29/09/2017	15/12/2017	Concluída
Execução de Galerias de Águas Pluviais da Rua Ângelo Gaioto, no Jardim Santa Rita	Oeste	SMGP 0422/2017	1	272,91	m	R\$ -	R\$ 203.857,20	R\$ 203.857,20	Próprio	30/04/2018	18/05/2018	Concluída
Recomposição de rede de galerias pluviais e execução de obra de contenção no Remanescente do Lote 342 da Gleba Jacutinga- Jardim Leonor, na Rua Professor Wilton Coutinho	Oeste	SMGP 200/2018	1	467,00	m	R\$ -	R\$ 2.733.602,56	R\$ 2.733.602,56	Próprio	11/08/2018	13/08/2019	Concluída

continua

CADERNO DE AÇÕES E OBRAS 2023 – 2017-2022

SMOP – Serviço Urbanos e Pavimentação – 2017 a 2023¹

continuação

Obras	Região(ões)	Edital	Quantidade (unidade)	Quantidade	Unidade	Valor (R\$)			Origem do recurso	Data de início	Data de conclusão ou previsão de	Status em 31/12/2023
						Vinculado	Próprio	Total				
Construção de Ciclovia na Avenida Saul Elkind, entre a Avenida Santo Magrini e Rua Firmino Almeida Tavares	Norte	SMGP 0015/2019	1	2.100,00	m	R\$ 308.578,28	R\$ -	R\$ 308.578,28	Federal	27/02/2019	24/09/2019	Concluída
Implantação do Arco Leste-Trecho 02, ligação da Av. dos Pioneiros à rotatória da UTFPR	Leste	SMGP 0039/2019	1	7.293,18	m ²	R\$ 911.996,29	R\$ 47.999,81	R\$ 959.996,10	Federal + próprio	08/04/2019	03/01/2020	Concluída
Execução de Remanejamento de Galerias de Águas Pluviais da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 24h do Jardim do Sol, na Rua Abélio Benatti, nº 3500	Oeste	SMGP 0054/2019	1	280,00	m	R\$ -	R\$ 170.556,56	R\$ 170.556,56	Próprio	22/05/2019	15/07/2019	Concluída
Execução de obras de Transposição do Ribeirão Esperança na Avenida Soiti Taruma, no trecho compreendido entre a Rua do Hipismo e as Ruas Romano Frasson e Manoel Pedro Macedo	Oeste	SMGP 0069/2019	1	2.244,68	m ²	R\$ -	R\$ 2.985.000,00	R\$ 2.985.000,00	Próprio	06/06/2019	02/05/2020	Concluída

continua

CADERNO DE AÇÕES E OBRAS 2023 – 2017-2022

SMOP – Serviço Urbanos e Pavimentação – 2017 a 2023¹

continuação

Obras	Região(ões)	Edital	Quantidade (unidade)	Quantidade	Unidade	Valor (R\$)			Origem do recurso	Data de início	Data de conclusão ou previsão de	Status em 31/12/2023
						Vinculado	Próprio	Total				
Execução de obras de Reforço de Galeria de Águas Pluviais, na Avenida Madre Henriqueta Dominici-Jardim Lagoa Dourada	Sul	SMGP 0106/2019	1	1.036,00	m	R\$ -	R\$ 594.073,64	R\$ 594.073,64	Próprio	24/07/2019	17/04/2020	Concluída
Recomposição da rede de águas pluviais na Rua Edmundo Gonçalves com a Rua Alexandre Sahyun	Sul	SMGP 0117/2019	1	176,00	m	R\$ -	R\$ 320.117,18	R\$ 320.117,18	Próprio	31/07/2019	08/11/2019	Concluída
Execução das obras para o alargamento da Av. Prefeito Faria Lima – Trecho 01	Oeste	SMGP 0308/2018	1	13.881,10	m ²	R\$ 2.532.944,12	R\$ 133.312,84	R\$ 2.666.256,96	Federal + próprio	02/11/2018	04/05/2020	Concluída
Execução de Pavimentação Asfáltica e Obras de Infraestrutura para o Alargamento da Rua Aminthas de Barros, Rua Antonio de Moraes Barros e Rua Senador Souza Naves	Centro	SMGP 0328/2018	1	17.872,87	m ²	R\$ 2.976.658,27	R\$ 156.666,23	R\$ 3.133.324,50	Federal + próprio	21/11/2018	17/06/2020	Concluída

continua

CADERNO DE AÇÕES E OBRAS 2023 – 2017-2022

SMOP – Serviço Urbanos e Pavimentação – 2017 a 2023¹

continuação

Obras	Região(ões)	Edital	Quantidade (unidade)	Quantidade	Unidade	Valor (R\$)			Origem do recurso	Data de início	Data de conclusão ou previsão de	Status em 31/12/2023
						Vinculado	Próprio	Total				
Execução de Recapeamento Asfáltico e Serviços Complementares, com Concreto Betuminoso Usinado a Quente- CBUQ, em vias urbanas do Município de Londrina	Diversas	SMGP 0339/2018	1	26.613,41	m ²	R\$ -	R\$ 1.024.537,57	R\$ 1.024.537,57	Próprio	11/09/2019	26/03/2020	Concluída
Execução de obras de drenagem para recuperação de erosão no Distrito de Paiquerê, na Avenida Voluntários da Pátria	Zona Rural	SMGP 0123/2019	1	1.817,00	m	R\$ -	R\$ 1.707.067,70	R\$ 1.707.067,70	Próprio	14/10/2019	08/07/2020	Concluída
Execução de reforço de galerias de águas pluviais na Rua Alfazema X Rua João Huss – Jd. Alto da Colina – Gleba Faz. Palhano	Sul	SMGP 0156/2019	1	675,00	m	R\$ -	R\$ 710.000,00	R\$ 710.000,00	Próprio	16/10/2019	11/06/2020	Concluída
Execução das obras para o prolongamento da Av. Europa – Trecho entre Chácaras Olaria e Residencial José Bastos de Almeida	Sul	SMGP 0251/2019	1	2.914,35	m ²	R\$ -	R\$ 579.999,00	R\$ 579.999,00	Próprio	21/02/2020	13/05/2020	Concluída

continua

CADERNO DE AÇÕES E OBRAS 2023 – 2017-2022

SMOP – Serviço Urbanos e Pavimentação – 2017 a 2023¹

continuação

Obras	Região(ões)	Edital	Quantidade (unidade)	Quantidade	Unidade	Valor (R\$)			Origem do recurso	Data de início	Data de conclusão ou previsão de	Status em 31/12/2023
						Vinculado	Próprio	Total				
Construção de rampas de acessibilidade e a instalação de defesa metálica na Av. Faria Lima	Oeste	SMGP 0146/2020	1	609,00	m	R\$ -	R\$ 350.733,20	R\$ 350.733,20	Próprio	23/06/2020	18/09/2020	Concluída
Pavimentação de vias urbanas em CBUQ, 2.279,95 m ² - Distrito de Lerroville	Zona Rural	SMGP 0058/2019	1	2.279,95	m ²	R\$ 181.227,72	R\$ 180.537,48	R\$ 361.765,20	Estadual + próprio	24/05/2019	18/06/2020	Concluída
Arco Leste – Trecho 03, ligação da Av. José Ventura Filho à Av. Robert Koch	Leste	SMGP 0249/2019	1	44.379,30	m	R\$ 8.042.135,12	R\$ 2.457.864,88	R\$ 10.500.000,00	Federal + próprio	16/12/2019	06/07/2021	Concluída
Implantação do bueiro celular triplo na Estrada Londrina-Warta - Transposição do Córrego Poço Fundo	Norte	SMGP 0226/2019	1	149,76	m ³	R\$ -	R\$ 487.777,77	R\$ 487.777,77	Próprio	10/02/2020	30/09/2020	Concluída
Arco Leste- Trecho 01	Leste	SMGP 0205/2019	1	7.823,95	m ²	R\$ 3.003.884,55	R\$ 1.493.133,75	R\$ 4.497.018,30	Federal + próprio	29/11/2018	21/04/2021	Concluída
Pavimentação e Drenagem para a Implantação do BHLS- Av. Winston Churchill	Norte	SMGP 0250/2019	1	105.092,0	m ²	R\$ 9.408.131,83	R\$ 1.433.415,13	R\$ 10.841.546,96	Federal + próprio	17/03/2020	18/10/2021	Concluída
Pavimentação e Drenagem para a Implantação do BHLS- Av. Francisco Gabriel Arruda	Norte	SMGP 0125/2019	1	27.578,20	m ²	R\$ 4.428.541,39	R\$ 674.728,88	R\$ 5.103.270,27	Federal + próprio	18/09/2019	25/11/2020	Concluída

continua

CADERNO DE AÇÕES E OBRAS 2023 – 2017-2022

SMOP – Serviço Urbanos e Pavimentação – 2017 a 2023¹

continuação

Obras	Região(ões)	Edital	Quantidade (unidade)	Quantidade	Unidade	Valor (R\$)			Origem do recurso	Data de início	Data de conclusão ou previsão de	Status em 31/12/2023
						Vinculado	Próprio	Total				
Pavimentação e Drenagem para Implantação do BHLS- Av. Leste-Oeste- Trecho 01	Centro	SMGP 0018/2020	1	1.867,50	m³	R\$ 300.000,00	R\$ 8.208.038,87	R\$ 8.508.038,87	Federal + próprio	05/02/2020	21/09/2021	Concluída
Pavimentação e Drenagem para Implantação do BHLS- Av. Leste-Oeste- Trecho 02	Centro	SMGP 0019/2020	1	1.669,59	m³	R\$ 843.932,66	R\$ 5.539.089,47	R\$ 6.383.022,01	Federal + próprio	05/02/2020	21/09/2021	Concluída
Adequação viária da Av. Ayrton Senna da Silva	Sul	SMGP 0051/2020	1	5.344,85	m²	R\$ -	R\$ 616.242,17	R\$ 616.242,17	Próprio	01/06/2020	29/10/2020	Concluída
Revitalização do Fundo de Vale Lagoa Dourada	Sul	SMGP 0031/2020	1	3.210,22	m²	R\$ -	R\$ 1.122.178,61	R\$ 1.122.178,61	Próprio	23/03/2020	08/09/2021	Concluída
Alargamento da Avenida Prefeito Faria Lima- Trecho 02	Oeste	SMGP 0309/2018	1	10.730,70	m²	R\$ 3.804.655,39	R\$ 300.245,02	R\$ 4.104.900,41	Federal + próprio	10/06/2019	14/06/2021	Concluída
Duplicação da Avenida dos Pioneiros	Leste	SMGP 0081/2020	1	10.095,26	m²	R\$ -	R\$ 2.668.977,98	R\$ 2.668.977,98	Próprio	18/05/2020	30/06/2021	Concluída
Duplicação da Avenida Guilherme de Almeida, entre a Rua Rinaldo dos Santos e Rua dos Zeladores	Sul	SMGP 0078/2020	1	255,53	m³	R\$ -	R\$ 2.039.657,90	R\$ 2.039.657,90	Próprio	15/05/2020	12/11/2020	Concluída
Prolongamento da Rua Dom Bosco	Centro	SMGP 0152/2020	1	816,81	m²	R\$ -	R\$ 213.105,81	R\$ 213.105,81	Próprio	01/07/2020	28/10/2020	Concluída
Reforço da rede de galerias na Av. Saul Elkind e na Rua Waldyr de Azevedo	Norte	SMGP 0174/2020	1	1.403,00	m	R\$ -	R\$ 1.764.930,26	R\$ 1.764.930,26	Próprio	07/08/2020	31/03/2021	Concluída

continua

CADERNO DE AÇÕES E OBRAS 2023 – 2017-2022

SMOP – Serviço Urbanos e Pavimentação – 2017 a 2023¹

continuação

Obras	Região(ões)	Edital	Quantidade (unidade)	Quantidade	Unidade	Valor (R\$)			Origem do recurso	Data de início	Data de conclusão ou previsão de	Status em 31/12/2023
						Vinculado	Próprio	Total				
Execução de Galerias de Águas Pluviais da Av. Brasília até o Ribeirão Quati	Norte	SMGP 0060/2019	1	232,00	m	R\$ -	R\$ 766.155,44	R\$ 766.155,44	Próprio	13/06/2019	22/05/2020	Concluída
Prolongamento da Rua Peru, entre Rua Nicarágua e Rua Argolo Ferrão	Centro	SMGP 0239/2019	1	1.871,05	m ²	R\$ -	R\$ 1.029.751,63	R\$ 1.029.751,63	Próprio	17/01/2020	23/07/2021	Concluída
Recuperação da Ponte sobre o Ribeirão Três Bocas- Parque Daisaku Ikeda- Lote 01	Zona Rural	SMGP 0192/2020	1	17,93	m ³	R\$ -	R\$ 306.163,56	R\$ 306.163,56	Próprio	17/09/2020	19/04/2021	Concluída
Recuperação da Ponte sobre o Rib. Três Bocas, situada no prolong. da R. Monte Carmelo - Lote 02	Zona Rural	SMGP 0197/2020	1	12,79	m ³	R\$ -	R\$ 291.957,34	R\$ 291.957,34	Próprio	17/09/2020	19/04/2021	Concluída
Recuperação da ponte sobre o Rib. Cafezal, situada no prolong. da Av. dos Ipês- Lote 03	Zona Rural	SMGP 0198/2020	1	11,68	m ³	R\$ -	R\$ 325.777,64	R\$ 325.777,64	Próprio	17/09/2020	19/04/2021	Concluída
Drenagem da Rua Pirapó	Centro	SMGP 0100/2020	1	194,00	m	R\$ -	R\$ 179.764,31	R\$ 179.764,31	Próprio	12/05/2020	20/08/2020	Concluída
Execução de 530.200m ² de recapeamento asfáltico em vias urbanas do Município de Londrina e serviços complementares	Diversas	SMGP 0207/2018	1	530.200,0	m ²	R\$ 12.438.855,03	R\$ -	R\$ 12.438.855,03	Estadual	15/06/2018	26/05/2020	Concluída

continua

CADERNO DE AÇÕES E OBRAS 2023 – 2017-2022

SMOP – Serviço Urbanos e Pavimentação – 2017 a 2023¹

continuação

Obras	Região(ões)	Edital	Quantidade (unidade)	Quantidade	Unidade	Valor (R\$)			Origem do recurso	Data de início	Data de conclusão ou previsão de	Status em 31/12/2023
						Vinculado	Próprio	Total				
Execução de Galerias de Águas Pluviais na Avenida Guilherme de Almeida- Fase II	Sul	SMGP 0188/2020	1	362,00	m	R\$ 187.256,43	R\$ -	R\$ 187.256,43	Federal	14/10/2020	16/06/2021	Concluída (rescisão parcial)
Execução das obras de implantação do Loteamento Cidade Industrial de Londrina- CILON	Norte	SMGP 0219/2020	1	395.172,5	m ²	R\$ 1.252.964,75	R\$ -	R\$ 1.252.964,75	Estadual	23/11/2020	28/01/2022	Rescindida unilateralmente
Interseção em desnível com túnel Cut and Cover no cruzamento da Av. Rio Branco com a Av. Arcebispo Dom Geraldo Fernandes	Oeste	SMGP 0258/2020	1	24.929,00	m ²	R\$ 25.547.727,08	R\$ 6.507.638,82	R\$ 32.055.365,90	Próprio + federal	21/01/2021	30/04/2024	Em andamento
Adequação Geométrica na Avenida Dez de Dezembro para acesso à Rua Bolívia, Rua Adriático e Rua Peru, em Londrina-PR	Centro	SMGP 0221/2021	1	5.650,00	m ²	R\$ -	R\$ 3.018.932,22	R\$ 3.018.932,22	Próprio	25/02/2021	11/07/2022	Concluída
Adequação Geométrica na Interseção Viária da Avenida Madre Leônia Milito com a PR-445, em Londrina-PR	Sul	SMGP 0004/2021	1	1.571,46	m ²	R\$ 145.331,11	R\$ 872.183,49	R\$ 1.017.514,60	Próprio + federal	05/03/2021	10/10/2021	Concluída

continua

CADERNO DE AÇÕES E OBRAS 2023 – 2017-2022

SMOP – Serviço Urbanos e Pavimentação – 2017 a 2023¹

continuação

Obras	Região(ões)	Edital	Quantidade (unidade)	Quantidade	Unidade	Valor (R\$)			Origem do recurso	Data de início	Data de conclusão ou previsão de	Status em 31/12/2023
						Vinculado	Próprio	Total				
Execução das obras para a Implantação da Rua Gino Tamiozzo- Fase 01	Leste	SMGP 0007/2021	1	847,00	m	R\$ -	R\$ 1.391.788,85	R\$ 1.391.788,85	Próprio	11/02/2021	11/07/2021	Concluída
Execução das obras para a Implantação da Rua Gino Tamiozzo- Fase 02	Leste	SMGP 0008/2021	1	6.612,01	m³	R\$ -	R\$ 486.416,56	R\$ 486.416,56	Próprio	11/02/2021	11/07/2021	Concluída
Execução das obras de Rede de Galerias Pluviais do Emissário do C.H. São Lourenço	Sul	SMGP 0042/2021	1	1.550,00	m	R\$ 1.052.713,25	R\$ -	R\$ 1.052.713,25	Federal	20/05/2021	17/12/2021	Concluída
Pavimentação e Infraestrutura na Rua da Canoagem	Sul	SMGP 0062/2021	1	5.900,00	m²	R\$ 372.792,43	R\$ -	R\$ 372.792,43	Federal	27/06/2021	27/09/2021	Concluída
Execução da Drenagem das Rua Alaerte F. Zanoni e Rua Amaury de O. Silva, Jardim Tarumã- Lote 02	Leste	SMGP 0080/2021	1	231,00	m	R\$ 162.097,27	R\$ -	R\$ 162.097,27	Federal	12/08/2021	08/10/2021	Concluída
Instalação e implantação de defensas metálicas e implantação de ciclovia na via implantada do Arco Leste Trecho 3	Leste	SMGP 0249/2019	1	676,00	m	R\$ 207.839,14	R\$ 150.000,00	R\$ 357.839,14	Federal + próprio	03/11/2021	23/11/2021	Concluída

continua

CADERNO DE AÇÕES E OBRAS 2023 – 2017-2022

SMOP – Serviço Urbanos e Pavimentação – 2017 a 2023¹

continuação

Obras	Região(ões)	Edital	Quantidade (unidade)	Quantidade	Unidade	Valor (R\$)			Origem do recurso	Data de início	Data de conclusão ou previsão de	Status em 31/12/2023
						Vinculado	Próprio	Total				
Execução das obras de recuperação de pavimento, reparos em drenagem e calçadas, implantação de rampas de acessibilidade e recapeamento asfáltico das Ruas Brasil, Tremembés, Uruguai e Av. Luigi Amorese	Diversas	SMGP-0017/2022	1	69.623,95	m ²	R\$ 4.833.075,88	R\$ -	R\$ 4.833.075,88	Estadual	19/02/2022	14/06/2023	Concluída
Execução da obra de Reforço de Drenagem Rua Marselha	Sul	SMGP-0034/2022	1	635,00	m	R\$ -	R\$ 856.754,87	R\$ 856.754,87	Próprio	04/04/2022	27/02/2023	Concluída
Execução das Obras de Recapeamento Asfáltico das Ruas Madre Henriqueta Dominici e Sebastião A.S. Callero.	Sul	SMGP-0067/2021	1	602,88	m ³	R\$ 500.000,00	R\$ 162.338,12	R\$ 662.338,12	Federal + próprio	05/07/2022	03/10/2022	Concluída
Execução das obras de Recapeamento asfáltico de vias públicas do Município de Londrina-PR- Lotes 01 e 02	Centro	SMGP-0072/2021	1	584,43	m ³	R\$ 1.200.155,82	R\$ -	R\$ 1.200.155,82	Federal	10/06/2022	30/06/2022	Concluída
Execução da obra de Reconstrução do Muro de Ala do Bueiro Celular do Lago Igapó 2.	Centro	SMGP-0040/2022	1	11,73	m ³	R\$ -	R\$ 62.927,23	R\$ 62.927,23	Próprio	04/04/2022	07/12/2022	Concluída

continua

CADERNO DE AÇÕES E OBRAS 2023 – 2017-2022

SMOP – Serviço Urbanos e Pavimentação – 2017 a 2023¹

continuação

Obras	Região(ões)	Edital	Quantidade (unidade)	Quantidade	Unidade	Valor (R\$)			Origem do recurso	Data de início	Data de conclusão ou previsão de	Status em 31/12/2023
						Vinculado	Próprio	Total				
Execução das obras para a adequação viária em rótula do encontro das Avenida Santos Dumont e Comandante João Ribeiro de Barros.	Leste	SMGP-0047/2022	1	103,09	m	R\$ -	R\$ 226.136,95	R\$ 226.136,95	Próprio	29/04/2022	25/10/2022	Concluída
Execução das obras de recuperação de pavimento, reparos em drenagem e calçadas, implantação de rampas de acessibilidade e recapeamento asfáltico das seguintes vias no Distrito de Lerroville:- Av. Dr. Gustavo Avelino Correia; - e Rua Bahia.	Zona rural	SMGP-0110/2022	1	6.752,29	m ²	R\$ 285.000,00	R\$ 123.550,52	R\$ 408.550,52	Estadual + Próprio	04/07/2022	01/11/2022	Concluída
Pavimentação e Drenagem- Rua Acyilino Nascimento	Oeste	SMGP-0080/2022	1	2.287,82	m ²	R\$ -	R\$ 725.447,44	R\$ 725.447,44	Próprio	13/06/2022	20/05/2023	Concluída
Recapeamento asfáltico da Av. Jamil Scaff	Leste	SMGP-0150/2022	1	45.957,47	m ²	R\$ 3.263.595,70	R\$ -	R\$ 3.263.595,70	Estadual	01/09/2022	17/07/2023	Concluída
Construção de Ponte de Concreto Armado sobre a Água do Gramadinho, na Estrada Paiquerê- Guairacá	Zona rural	SMGP-0157/2022	1	1.988,56	m ²	R\$ 3.470.328,64	R\$ -	R\$ 3.470.328,64	Estadual	06/02/2023	11/11/2023	Concluída

continua

CADERNO DE AÇÕES E OBRAS 2023 – 2017-2022


SMOP – Serviço Urbanos e Pavimentação – 2017 a 2023¹

continuação


Obras	Região(ões)	Edital	Quantidade (unidade)	Quantidade	Unidade	Valor (R\$)			Origem do recurso	Data de início	Data de conclusão ou previsão de	Status em 31/12/2023
						Vinculado	Próprio	Total				
Execução das juntas de dilatação da ponte situada entre os distritos de Paiquerê e Guairacá, sobre o rio Taquara	Zona rural	SMGP-0177/2023	1	15,72	m	R\$ -	R\$ 42.915,64	R\$ 42.915,64	Próprio	27/10/2023	26/11/2023	Concluída
Total	-	-	69	-	-	R\$108.999.407,37	R\$ 61.131.992,62	R\$170.131.399,87	-	-	-	-

Nota: 1. Recorte temporal estabelecido pela fonte.

SMOP – Serviços Urbanos e Pavimentação – Quantidade de obras, por status e região – 2017 a 2023

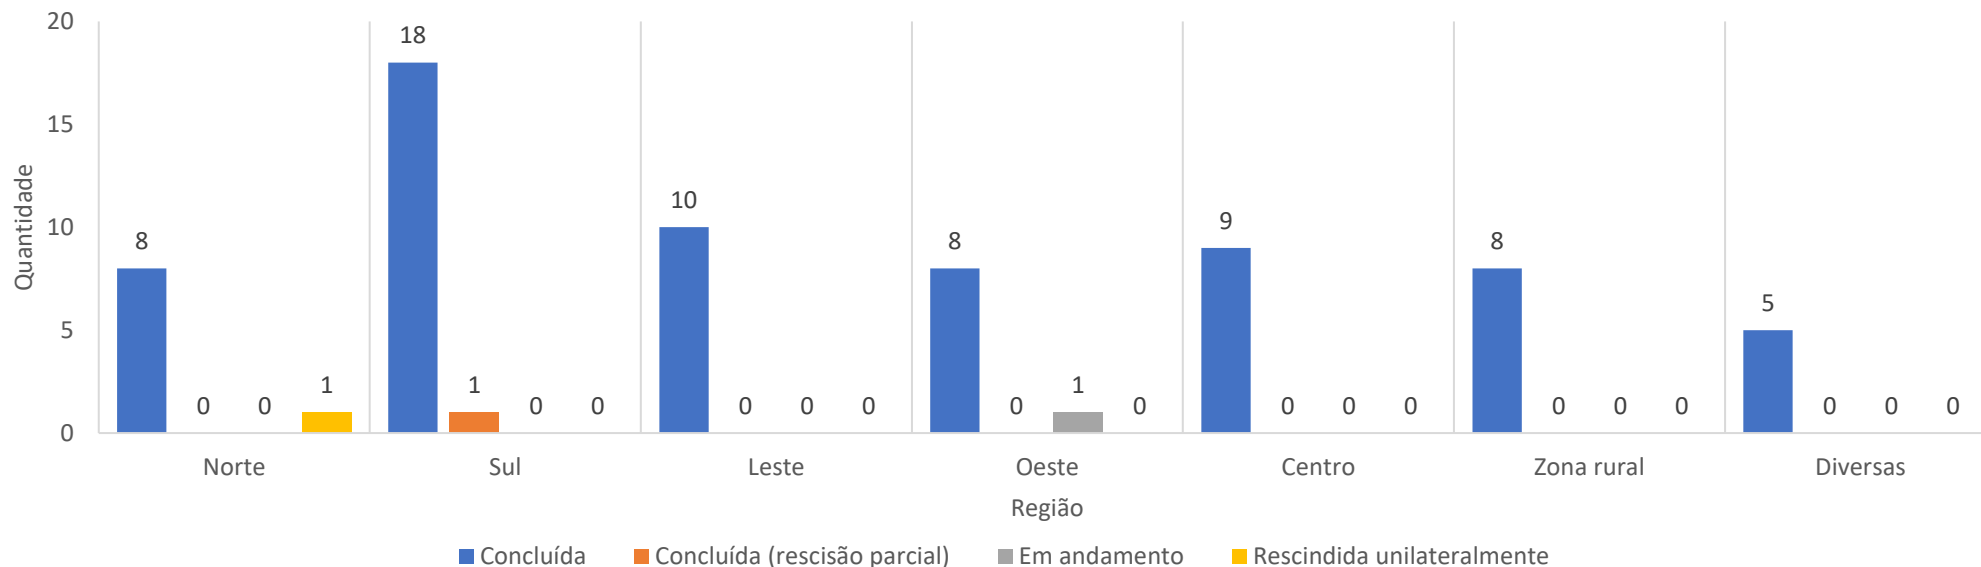

SMOP – Serviços Urbanos e Pavimentação – Valor de obras, por status e região – 2017 a 2023

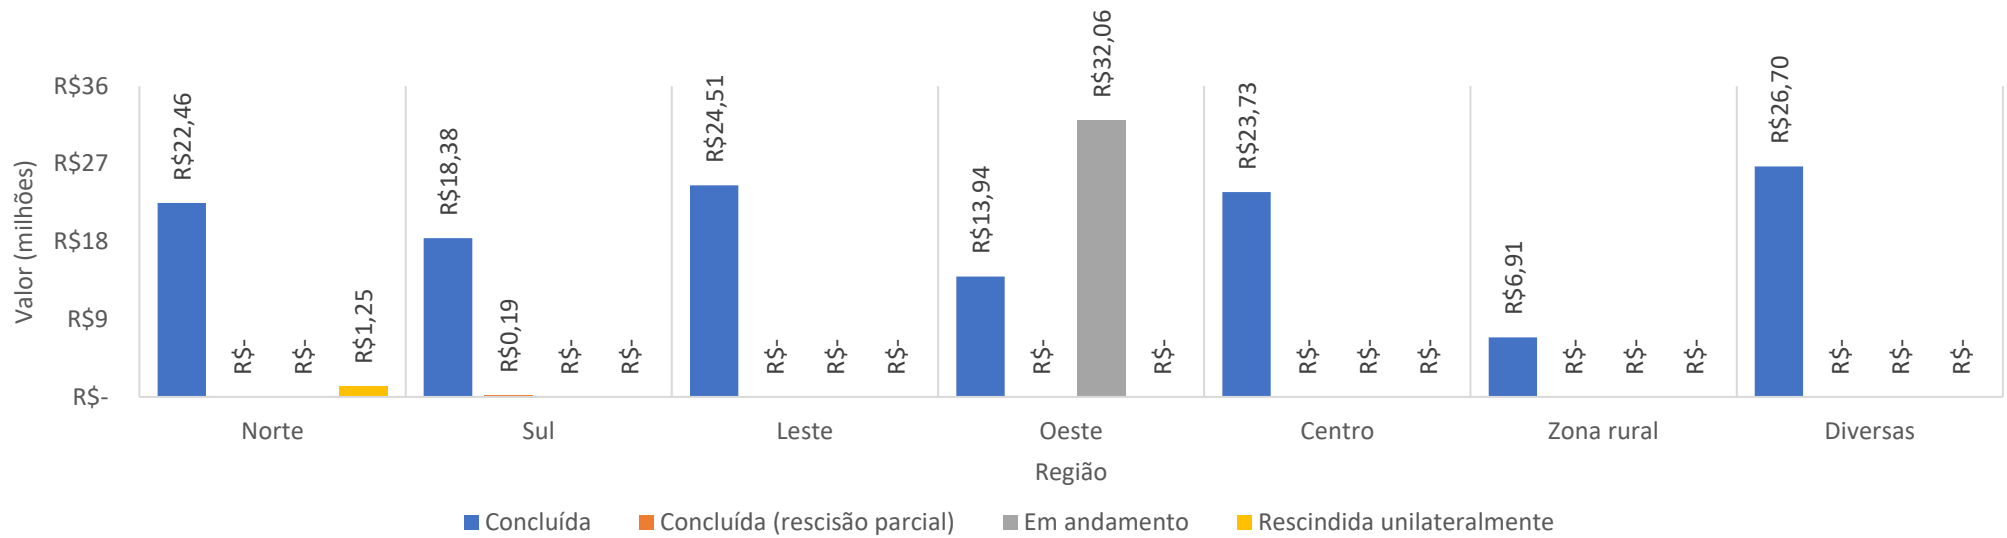

Fonte: PML/Secretaria Municipal de Obras e Pavimentação – SMOP (2024).

Organização dos dados: PML/SMPOT/DP/Gerência de Pesquisas e Informações.
